

EMPRESA PÚBLICA DE ÁRIDOS Y ASFALTOS DEL AZUAY ASFALTAR EP

Informe del Periodo Fiscal 2025

Javier Fernández de Córdova Webster

Gerente General

Abril – 2026

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	1
2.	JUSTIFICACIÓN.....	1
3.	MARCO LEGAL	2
4.	INFORME DE GESTIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA DE ÁRIDOS Y ASFALTOS DEL AZUAY ASFALTAR EP DEL AÑO FISCAL 2025.....	8
4.1.	GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.....	8
4.1.1.	ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PERIODO 2025	8
4.1.2.	PRESUPUESTO DE INGRESOS EJECUTADO PERÍODO 2025.....	8
4.1.3.	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR GRUPO.....	8
4.1.4.	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO	8
4.1.5.	GRÁFICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS	9
4.1.6.	INGRESOS CORRIENTES.....	9
4.1.7.	EJECUCIÓN DE INGRESOS CORRIENTES.....	9
4.1.8.	INGRESO DE CAPITAL	11
4.1.9.	EJECUCIÓN DE INGRESOS DE CAPITAL	11
4.1.10.	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	11
4.1.11.	EJECUCIÓN DE INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	12
4.1.12.	PRESUPUESTO DE GASTO EJECUTADO 2025.....	12
4.1.13.	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO	12
4.1.14.	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO	13
4.1.15.	GRÁFICO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS.....	13
4.1.16.	EGRESOS CORRIENTES	14
4.1.17.	EGRESOS DE PRODUCCIÓN:.....	15
4.1.18.	EGRESOS DE CAPITAL.....	16
4.1.19.	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	17
4.1.20.	COMPARATIVO INGRESOS CONTRA GASTOS DEVENGADOS...	17
4.1.21.	ESTADO DE RESULTADOS PERIODO 2025.....	18
4.2.	GESTIÓN TÉCNICA	20
4.2.1.	PROYECTOS DE MEJORAMIENTO VIAL.....	20
4.2.2.	PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS	20
4.2.3.	BENEFICIARIOS	20
4.2.4.	RESULTADOS ALCANZADOS	26
4.2.5.	ACTIVIDADES REALIZADAS	27

4.2.6.	AVANCE FINANCIERO.....	27
4.2.7.	AVANCE ECONÓMICO.....	28
4.2.8.	PRINCIPALES DIFICULTADES.....	42
4.2.9.	RESUMEN DE CONTRATOS DE OBRA Y/O CONVENIOS.....	44
4.2.10.	DETALLE DE CONTRATOS DE OBRA.....	49
4.3.	GESTIÓN DE COMERCIALIZACIÓN.....	73
4.3.1.	OBJETIVO GENERAL.....	73
4.3.2.	RESULTADOS ALCANZADOS.....	73
4.3.3.	PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS.....	74
4.4.	GESTIÓN DE PRODUCCIÓN.....	89
4.4.1.	ACTIVIDADES REALIZADAS.....	89
4.4.2.	ACTIVIDADES REALIZADAS.....	89
4.4.3.	RESULTADOS ALCANZADOS.....	89
4.4.4.	PROYECTOS RELEVANTES EN EJECUCIÓN.....	90
4.4.5.	CONCLUSIONES GESTIÓN TÉCNICA.....	90
4.5.	GESTIÓN DE PEAJES.....	92
4.5.1.	OBJETIVO GENERAL.....	92
4.5.2.	RESULTADOS ALCANZADOS.....	92
4.5.3.	BENEFICIARIOS.....	92
4.5.4.	ACTIVIDADES REALIZADAS.....	92
4.5.5.	AVANCE FINANCIERO.....	95
4.5.6.	DIFICULTADES Y DESAFÍOS.....	95
4.5.7.	CONCLUSIONES.....	96
4.6.	GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS.....	97
4.6.1.	PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS.....	97
4.6.2.	PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.....	98
4.6.3.	RESULTADOS ECONÓMICOS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL AÑO.....	98
4.7.	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO.....	100
4.7.1.	PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS.....	100
4.7.2.	DESAFÍOS Y DIFICULTADES.....	103
5.	PREGUNTAS REALIZADAS POR LA CIUDADANÍA.....	106

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe correspondiente al ejercicio 2025 de la Empresa Pública de Áridos y Asfaltos del Azuay, ASFALTAR EP, constituye un instrumento técnico de evaluación de la gestión institucional, orientado a analizar el cumplimiento de la planificación empresarial, la ejecución presupuestaria y los resultados alcanzados en el marco de las competencias.

Este informe presenta de manera estructurada el trabajo desarrollado durante el año, evidenciando los avances obtenidos, los resultados alcanzados y los desafíos enfrentados. Su elaboración responde a la necesidad de contar con información clara, confiable y comparable, que permita fortalecer la toma de decisiones, el control interno y la mejora continua de una gestión pública eficiente y transparente.

Durante el año 2025, la Empresa Pública de Áridos y Asfaltos del Azuay ASFALTAR EP, ha reafirmado su rol como aliado estratégico de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del sur del país, impulsando importantes proyectos de infraestructura, construyendo obras de calidad mediante estándares de seguridad, con el objetivo de desarrollar y fortalecer la conectividad y las condiciones de vida de las familias.

Gestionar lo público implica grandes retos; sin embargo, también representa una profunda responsabilidad con la ciudadanía. Por ello, se ha trabajado con determinación y convicción para optimizar el uso de los recursos públicos, fortalecer la capacidad operativa de la empresa y generar nuevas oportunidades de desarrollo, guiados siempre por los principios de servicio público, eficiencia y compromiso social.

Esta rendición de cuentas constituye el resultado del esfuerzo honesto, responsable y comprometido de todo el equipo humano de ASFALTAR EP. Consideramos que únicamente mediante la participación y la coordinación de las autoridades competentes, las instituciones públicas, los organismos de control y la participación ciudadanía lograremos avanzar y transformar de manera conjunta el desarrollo integral y sostenible de la sociedad.

2. JUSTIFICACIÓN

Con el objeto de transparentar su gestión y en cumplimiento de la Resolución No. CPCS-PL-SE-004-O-2026-0030-28-01-2026 emitida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Este informe busca brindar a la ciudadanía las herramientas necesarias para participar activamente en el proceso de rendición de cuentas.

El Art. 96 de la Constitución de la República, reconoce toda forma de organización de los ciudadanos para incidir en decisiones, políticas públicas y control social de los distintos niveles de gobierno; el Art. 97 dicta las actividades



que las organizaciones sociales podrán realizar; el Art. 98 promulga el derecho a la resistencia frente a actos u omisiones del poder público, de personas naturales o jurídicas que vulneren sus derechos; el Art. 99 dice que la acción ciudadana podrá ejercerse en forma individual o en representación de una colectividad, cuando se produzca la violación de un derecho o la amenaza de su afectación.

El marco normativo establece que los procesos de rendición de cuentas deben ser sistemáticos, deliberados, interactivos y universales, con el fin de informar a la ciudadanía y someter a su evaluación las acciones y omisiones de las entidades públicas.

El marco normativo establece que los procesos de rendición de cuentas deben ser sistemáticos, deliberados, interactivos y universales, con el fin de informar a la ciudadanía y someter a su evaluación las acciones y omisiones de las entidades públicas.

3. MARCO LEGAL

De conformidad a lo dispuesto por la Constitución de la República en concordancia con la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social y Ley de Acceso a la Información Pública, la presente rendición de cuentas se sustenta en el siguiente marco normativo.

Constitución de la República del Ecuador

El Artículo 100 de la Constitución de la República del Ecuador 2008 (CRE), dispone que: *“En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos”* y el numeral 4, señala que *la participación en estas instancias se ejerce para “Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social”; además, establece que: “...para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios y las demás instancias que promueva la ciudadanía.”*; y concomitantemente, el numeral 4 del Artículo 64 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, prevé que, en todos los niveles de gobierno existirán instancias de participación, con la misma finalidad de fortalecer la democracia.

El numeral 2 del Artículo 208 de la Constitución de la República del Ecuador señala que, serán deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a más de lo previsto en la ley *“Establecer mecanismos de*



rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público, y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social”.

El artículo 225 señala que el sector público comprende, entre otros, a: “3) *Los organismos y entidades creados por la Ley para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado; y, 4) Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos;*”

El artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador determina: “*Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución*”;

Por otra parte, el primer inciso del Art. 315 de la Constitución de la República, dispone que: “*El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas*”.

Ley Orgánica de Empresas Públicas

El Art. 4 define “*Las empresas públicas son entidades que pertenecen al Estado en los términos que establece la Constitución de la República, personas jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. Estarán destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y en general al desarrollo de actividades económicas que corresponden al Estado.*”

El Art. 5 señala “*La creación de empresas públicas se hará: 2. Por acto normativo legalmente expedido por los gobiernos autónomos descentralizados; y, 3. Mediante escritura pública para las empresas que se constituyan entre la Función Ejecutiva y los gobiernos autónomos descentralizados, para lo cual se requerirá del decreto ejecutivo y de la decisión de la máxima autoridad del organismo autónomo descentralizado, en su caso.*”



Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social

El artículo 5 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social establece que al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social le compete:

“Art. 5.- Atribuciones generales. - 1. Promover la participación ciudadana, estimular procesos de Deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción. 2. Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público, y las personas jurídicas del sector privado que presten servicios públicos, desarrollen actividades de interés público o manejen recursos públicos.”

El Artículo 9 de la ley ibidem, en relación con la rendición de cuentas, establece que:

“Rendición de Cuentas.- Es atribución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social establecer mecanismos para someter a evaluación de la sociedad, las acciones del Estado y de las personas jurídicas del sector privado que presten servicios públicos, manejen recursos públicos o desarrollen actividades de interés público; con atención al enfoque de derechos, a los resultados esperados y obtenidos, a los recursos financieros empleados y a los métodos utilizados sobre su gestión.”

El Artículo 10 del mismo cuerpo legal, determina los contenidos mínimos de la rendición de cuentas

“Art. 10.- Contenido de la rendición de cuentas. - El proceso de rendición de cuentas deberá contener al menos lo siguiente:

- 1. Cumplimiento de políticas, planes, programas y proyectos.*
- 2. Ejecución del presupuesto institucional.*
- 3. Cumplimiento de los objetivos y el plan estratégico de la entidad.*
- 4. Procesos de contratación pública.*
- 5. Cumplimiento de recomendaciones o pronunciamientos emanados por las entidades de la Función de Transparencia y Control Social y la Procuraduría General del Estado.*
- 6. Cumplimiento del plan de trabajo presentado ante el Consejo Nacional Electoral, en el caso de las autoridades de elección popular.*
- 7. En el caso de las empresas públicas y de las personas jurídicas del sector privado que presten servicios públicos, manejen recursos públicos o desarrollen actividades de interés público deberán presentar balances anuales y niveles de cumplimiento de obligaciones laborales, tributarias y cumplimiento de objetivos.*



8. *Las demás que sean de trascendencia para el interés colectivo.*”

Mientras que el artículo 11 del mismo cuerpo legal señala los obligados a rendir cuentas:

“Art. 11.- Obligados a rendir cuentas. - Tienen la obligación de rendir cuentas las autoridades del Estado electas o de libre remoción, representantes legales de empresas públicas o personas Jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés público, sin perjuicio de la responsabilidad que tienen las y los servidores públicos sobre sus actos u omisiones.”

Así también la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, indica:

“Art.- 88.- Derecho ciudadano a la rendición de cuentas.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual o colectiva, comunas, comunidades, pueblo y nacionalidades indígenas, pueblos afro ecuatoriano y montubio, y demás formas lícitas de organización, podrán solicitar una vez al año la rendición de cuentas a las instituciones públicas o privadas que presten servicios públicos, manejen recursos públicos o desarrollen actividades de interés público, así como a los medios de comunicación social, siempre que tal rendición de cuentas no esté contemplada mediante otro procedimiento de la Constitución y las leyes.”

De otro lado, el artículo 96 del mismo cuerpo legal, sobre el libre acceso a la información pública, establece que:

“Art. - 96.- Libre acceso a la información pública. - El Estado garantiza el derecho que tienen las ciudadanas y ciudadanos de acceso libremente a la información pública, de conformidad con la Constitución y la ley. Este derecho constituye un instrumento fundamental para ejercer la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el control social.”

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)

Asimismo, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la información pública (LOTAIP) en su Artículo 7, establece la obligatoriedad de la Difusión de la Información Pública y señala:

“Art. - 7.- Difusión de la Información Pública.- Por la transparencia en la gestión administrativa que están obligadas a observar todas las instituciones del Estado que conforman el sector público en los términos del artículo 118 de la Constitución Política de la República y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, difundirán a través de un portal de información o página web, así como de los medios necesarios a disposición del público, implementados en la misma institución, la siguiente información mínima actualizada, que para



efectos de esta Ley, se la considera de naturaleza obligatoria: m) Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, tales como metas e informes de gestión e indicadores de desempeño.”

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD)

El Artículo 3 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), establece que:

“Art. 3.- Principios. - El ejercicio de la autoridad y las potestades públicas de los gobiernos autónomos descentralizados se regirán por los siguientes principios:

- g) *Participación ciudadana. - La participación es un derecho cuya titularidad y ejercicio corresponde a la ciudadanía. El ejercicio de este derecho será respetado, promovido y facilitado por todos los órganos del Estado de manera obligatoria, con el fin de garantizar la elaboración y adopción compartida de decisiones, entre los diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía, así como la gestión compartida y el control social de planes, políticas, programas y proyectos públicos, el diseño y ejecución de presupuestos participativos de los gobiernos. En virtud de este principio, se garantizan además la transparencia y la rendición de cuentas, de acuerdo con la Constitución y la ley.”*

El literal del Artículo 41 del COOTAD, determina como una de las funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial:

- d) *“Elaborar y ejecutar el plan provincial de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, y realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas.”*

En relación con las atribuciones del Prefecto en el artículo 50 literal u) de la misma normativa, señala que es atribución del prefecto o prefecta provincial:

- u) *“Presentar al consejo y a la ciudadanía en general un informe anual escrito, para su evaluación a través del sistema de rendición de cuentas y control social, acerca de la gestión administrativa realizada, destacando el estado de los servicios y de las demás obras públicas realizadas en el año anterior, los procedimientos empleados en su ejecución los costos unitarios y totales y la forma cómo se hubieren cumplido los planes y programas aprobados por el consejo.”*



Asimismo, el Artículo 266 ibidem sobre la Rendición de Cuentas, señala que:

“Art.- 266.- Rendición de cuentas. - Al final del ejercicio fiscal el ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado convocará a la asamblea territorial o al organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia de participación, para informar sobre la ejecución presupuestaria anual, sobre el cumplimiento de sus metas, y sobre las prioridades de ejecución del siguiente año.”

Sobre la Participación Ciudadana en los Gobiernos Autónomos Descentralizados, el artículo 302 del COOTAD y en concordancia con el artículo 95 de la Constitución, establece que:

“Art.- 302.- Participación ciudadana.- La ciudadanía, en forma individual y colectiva, podrán participar de manera protagónica en la toma de decisiones, la planificación y gestión de los asuntos públicos y en el control social de las instituciones de los gobiernos autónomos descentralizados y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano”, además, señala que: “las autoridades ejecutivas y legislativas de los gobiernos autónomos descentralizados tendrán la obligación de establecer un sistema de rendición de cuentas a la ciudadanía conforme el mandato de la ley y de sus propias normativas.”



4. INFORME DE GESTIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA DE ÁRIDOS Y ASFALTOS DEL AZUAY ASFALTAR EP DEL AÑO FISCAL 2025

4.1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

4.1.1. ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PERIODO 2025

La Empresa Pública de Áridos y Asfaltos del Azuay ASFALTAR EP inició el ejercicio fiscal 2025 con un presupuesto aprobado de USD\$ 18.254.929,66 tanto en ingresos como en egresos.

Con fecha 8 de diciembre de 2025, se aprobó la reforma presupuestaria que decrementó en USD\$ 5.918.567,81 el presupuesto inicial. Como resultado, el monto codificado final, tanto para ingresos como para gastos, quedó establecido en USD\$ 12.336.361,85. En adelante, este valor se denominará “monto codificado” o simplemente “codificado”.

4.1.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS EJECUTADO PERÍODO 2025

La ejecución presupuestaria de ingresos desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 es de USD\$ 9.512.121,23 equivalente al 77,11% con relación al monto codificado, cuya composición es la siguiente:


4.1.3. PRESUPUESTO DE INGRESOS POR GRUPO

Código	Nombre	Codifica	Devengado	Porcentaje
1	INGRESOS CORRIENTES	11.646.227,85	9.034.494,32	77.57%
2	INGRESOS DE CAPITAL	30.134,00	16.451,33	54.59%
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	660.000,00	461.175,58	69.88%
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		12.336.361,85	9.512.121,23	77.11%

4.1.4. PRESUPUESTO DE INGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO

Código	Nombre	Codifica	Devengado	Porcentaje
1	INGRESOS CORRIENTES	11.646.227,85	9.034.494,32	77.57%
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	672.788,90	641.719,05	95.38%
14	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS	9.993.023,26	7.515.175,49	75.20%
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	160.048,00	149.674,17	93.52%
18	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	789.645,18	721.793,92	91.41%
19	OTROS INGRESOS	30.722,51	6.131,69	19.96%
2	INGRESOS DE CAPITAL	30.134,00	16.451,33	54.59%
24	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30.134,00	16.451,33	54.59%
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	660.000,00	461.175,58	69.88%
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO			0%
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	660.000,00	461.175,58	69.88%
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		12.336.361,85	9.512.121,23	77.11%

4.1.5. GRÁFICO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS

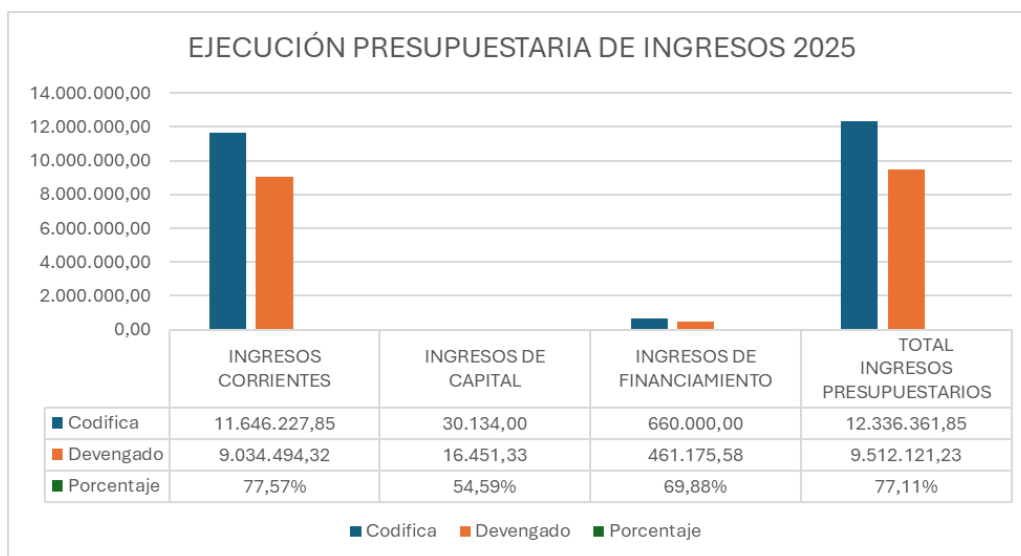

4.1.6. INGRESOS CORRIENTES

“Proviene del poder impositivo ejercido por el Estado de la venta de bienes y servicios, de la renta del patrimonio y de ingresos sin contraprestación. Están conformados por impuestos; fondos de la seguridad social; tasas y contribuciones; venta de bienes y servicios; renta de inversiones; multas tributarias y no tributarias; transferencias, donaciones; y, otros ingresos. En la ejecución, su devengo produce contablemente modificaciones indirectas en la estructura patrimonial de Estado, debido a la utilización de cuentas operacionales o de resultados que permiten establecer previamente el resultado de la gestión anual...”

Fuente: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS DEL ECUADOR CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO

4.1.7. EJECUCIÓN DE INGRESOS CORRIENTES

La ejecución de los Ingresos Corrientes representa un 77.57% del codificado, el rubro con más participación porcentual corresponde al subgrupo 13 “TASAS Y CONTRIBUCIONES”, con una ejecución presupuestaria de USD\$ 641.719,05, lo que representa el 95.38% del total del codificado USD\$ 672.788,90 correspondiente al cobro en los peajes en garitas; sin embargo, el mayor peso presupuestario es el subgrupo 14 Ventas de bienes y servicios de entidades e ingresos operativos.


En el subgrupo 14 Ventas de Bienes y Servicios de Entidades e Ingresos Operativos, existe una ejecución del 75.20% equivalente a USD\$ 7,515.175,49 del total codificado de USD\$9,993.023,26 por concepto de facturación de venta de asfalto y áridos, y la facturación de contratos por obras ejecutadas, éste último rubro como el de mayor incidencia.

En el subgrupo 17, Rentas de Inversiones y Multas existe una ejecución del 93.52% equivalente a USD\$ 149.674,17 del total codificado de USD\$160,048.00 por el alquiler de maquinaria.

El subgrupo 18 Transferencias o Donaciones Corrientes (convenio 71-2016 por la gestión y operación del sistema provincial de peajes delegado por el GPA) existe una ejecución del 91,41% equivalente a USD\$ 721.793,92 del total codificado de USD\$ 789.645,18.

Dentro del subgrupo 19, Otros Ingresos existe una ejecución del 19,96% equivalente a USD\$ 6.131,69 del total codificado de USD\$ 30.722,51.

Código	Nombre	Codifica	Devengado	Porcentaje
1	INGRESOS CORRIENTES	11.646.227,85	9.034.494,32	77,57%
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	672.788,90	641.719,05	95.38%
14	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATI	9.993.023,26	7.515.175,49	75.20%
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	160.048,00	149.674,17	93.52%
18	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	789.645,18	721.793,92	91.41%
19	OTROS INGRESOS	30.722,51	6.131,69	19.96%

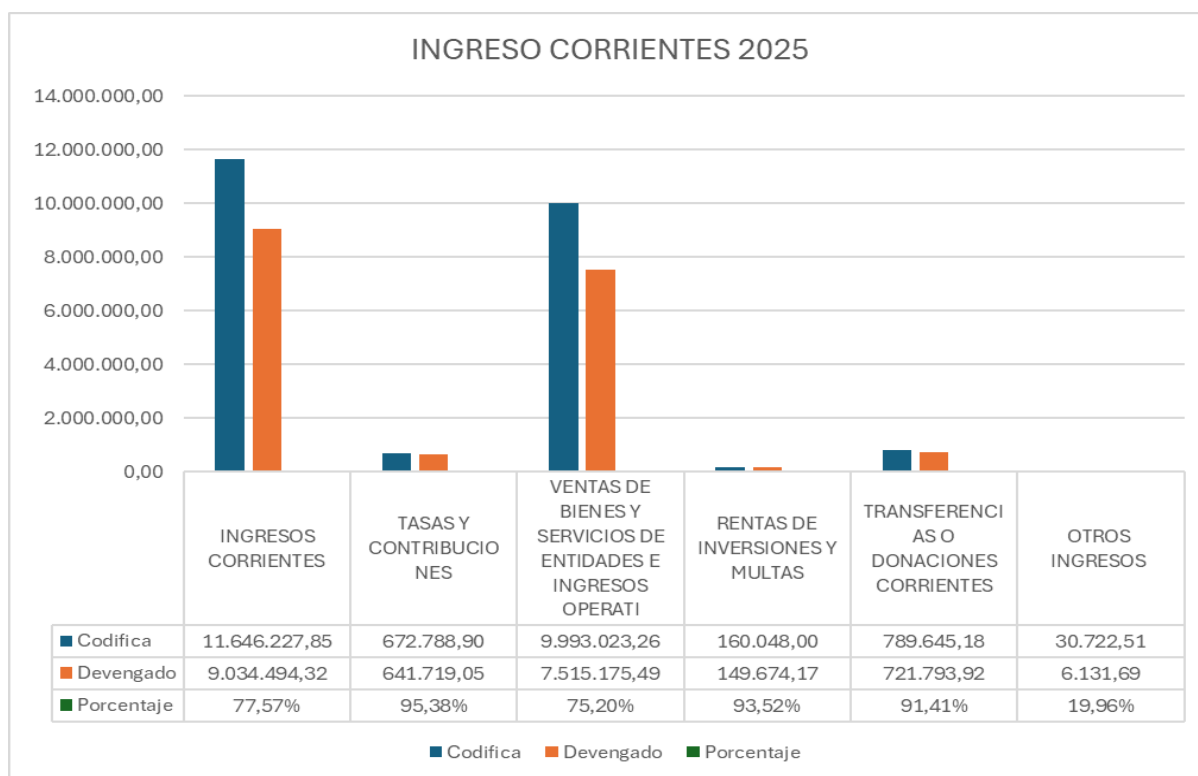

4.1.8. INGRESO DE CAPITAL


“Los ingresos de capital provienen de la venta de bienes de larga duración, intangibles, recursos públicos de origen petrolero, recuperación de inversiones y recepción de fondos como transferencias o donaciones, destinadas a financiar egresos de capital e inversión, su devengo produce contablemente modificaciones directas en la composición patrimonial del Estado.”

Fuente: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS DEL ECUADOR CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO

4.1.9. EJECUCIÓN DE INGRESOS DE CAPITAL

La ejecución de los Ingresos de Capital registra un 54,59% de cumplimiento, equivalente a USD 16.451,33, respecto total codificado de USD 30.134,00. Dicho valor corresponde a los recursos generados por la venta de vehículos efectuada a través del procedimiento de remate.

Código	Nombre	Codifica	Devengado	Porcentaje
2	INGRESOS DE CAPITAL	30.134,00	16.451,33	54,59%
24	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30.134,00	16.451,33	54,59%
2401	BIENES MUEBLES	30.134,00	16.451,33	54,59%

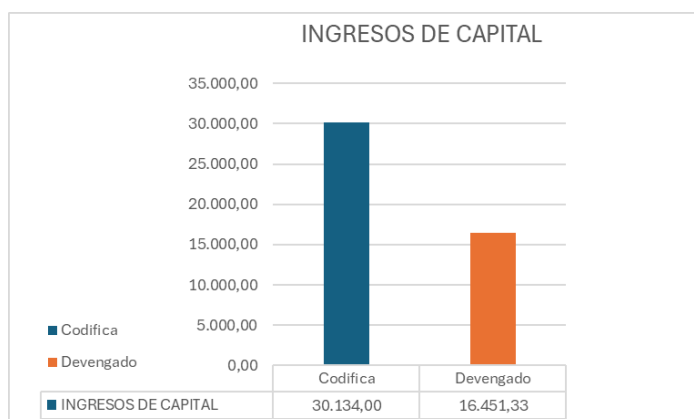

4.1.10. INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

“Constituyen fuentes adicionales de recursos obtenidos por el Estado, a través de la captación del ahorro interno o externo para financiar prioritariamente proyectos de inversión. Están conformados por los ingresos provenientes de la colocación de títulos valores, contratación de deuda pública externa e interna y saldos de ejercicios anteriores.


El devengo de los ingresos de financiamiento produce contablemente modificaciones directas en la estructura patrimonial del Estado, que se evidencian en el aumento de sus obligaciones internas y externas.”

Fuente: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS DEL ECUADOR CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO

4.1.11. EJECUCIÓN DE INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

La ejecución de los Ingresos de Financiamiento alcanza el 69.88% equivalente a USD\$ 461.175,58 de un total codificado de USD\$ 660.000,00 correspondientes al subgrupo 38 Cuentas pendientes por Cobrar (anticipos por devengar de ejercicios anteriores de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Empresas Públicas, compra de bienes y/o servicios; y, Construcción de Obras).

Código	Nombre	Codifica	Devengado	Porcentaje
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	660.000,00	461.175,58	69,88%
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	0,00	0,00	0%
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	660.000,00	461.175,58	69.88%

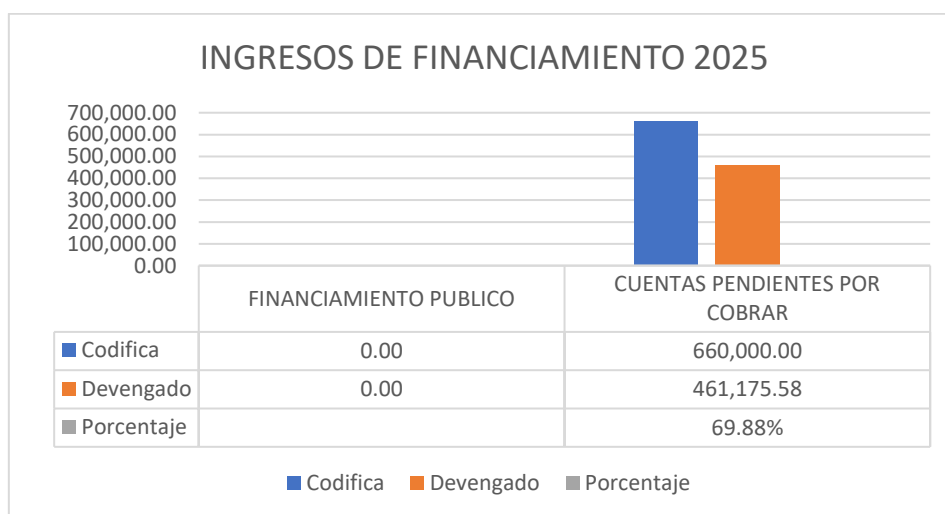

4.1.12. PRESUPUESTO DE GASTO EJECUTADO 2025

La ejecución presupuestaria de **Gastos** desde el 01 de enero de 2025 al 31 de diciembre 2025 es de **USD\$ 9.173.653,60** que representa el **74,36%** del total codificado de **USD\$ 12.336.361,85**, cuya composición es la siguiente:


4.1.13. PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO

Código	Nombre	Codifica	Devengado	Porcentaje
5	EGRESOS CORRIENTES	1.724.791,93	1.534.424,98	88,96%
6	EGRESOS DE PRODUCCION	10.515.224,81	7.578.067,53	72,07%
7	EGRESOS DE INVERSION	47,50	0,00	0,00%
8	EGRESOS DE CAPITAL	56.296,61	46.644,13	82,85%
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	40.001,00	14.516,96	36,29%
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		12.336.361,85	9.173.653,60	74,36%

4.1.14. PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO


Código	Nombre	Codifica	Devengado	Porcentaje
5	EGRESOS CORRIENTES	1.724.791,93	1.534.424,98	88,96%
51	EGRESOS EN PERSONAL	1.133.696,22	1.087.872,94	95,96%
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	350.053,65	292.660,46	83,60%
56	EGRESOS FINANCIEROS	47.263,60	47.159,02	99,78%
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	49.778,46	45.149,13	90,70%
58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	144.000,00	61.583,43	42,77%
6	EGRESOS DE PRODUCCION	10.515.224,81	7.578.067,53	72,07%
61	EGRESOS EN PERSONAL PARA LA PRODUCCION	2.530.978,73	2.349.734,53	92,84%
63	BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCION	7.870.072,97	5.118.486,46	65,04%
67	OTROS EGRESOS DE PRODUCCION	114.173,11	109.846,54	96,21%
7	EGRESOS DE INVERSION	47,50	0,00	0%
71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	47,50	0,00	0,00%
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0,00	0,00	0,00%
75	OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00%
8	EGRESOS DE CAPITAL	56.296,61	46.644,13	82,85%
84	BIENES DE LARGA DURACION (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	56.296,61	46.644,13	82,85%
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	40.001,00	14.516,96	36,29%
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	0%
97	PASIVO CIRCULANTE	10.000,00	0,00	0%
99	OTROS PASIVOS	30.001,00	14.516,96	48,39%
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		12.336.361,85	9.173.653,60	74,36%

4.1.15. GRÁFICO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

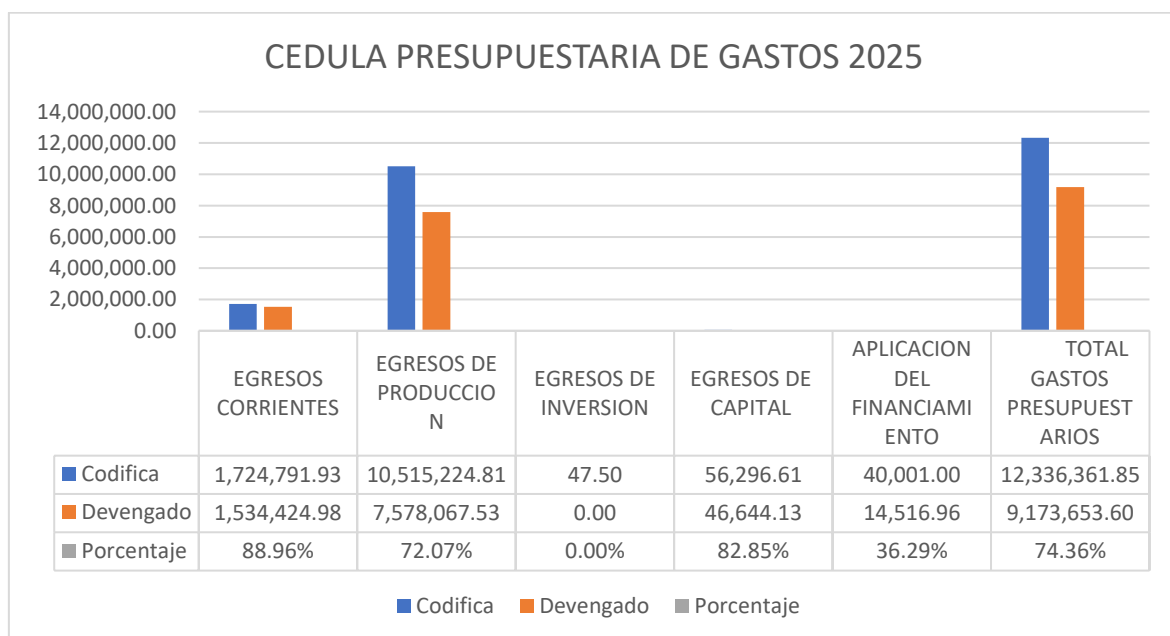

4.1.16. EGRESOS CORRIENTES

Código	Nombre	Codifica	Devengado	Porcentaje
5	EGRESOS CORRIENTES	1.724.791,93	1.534.424,98	88,96%
51	EGRESOS EN PERSONAL	1.133.696,22	1.087.872,94	95,96%
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	350.053,65	292.660,46	83,60%
56	EGRESOS FINANCIEROS	47.263,60	47.159,02	99,78%
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	49.778,46	45.149,13	90,70%
58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	144.000,00	61.583,43	42,77%

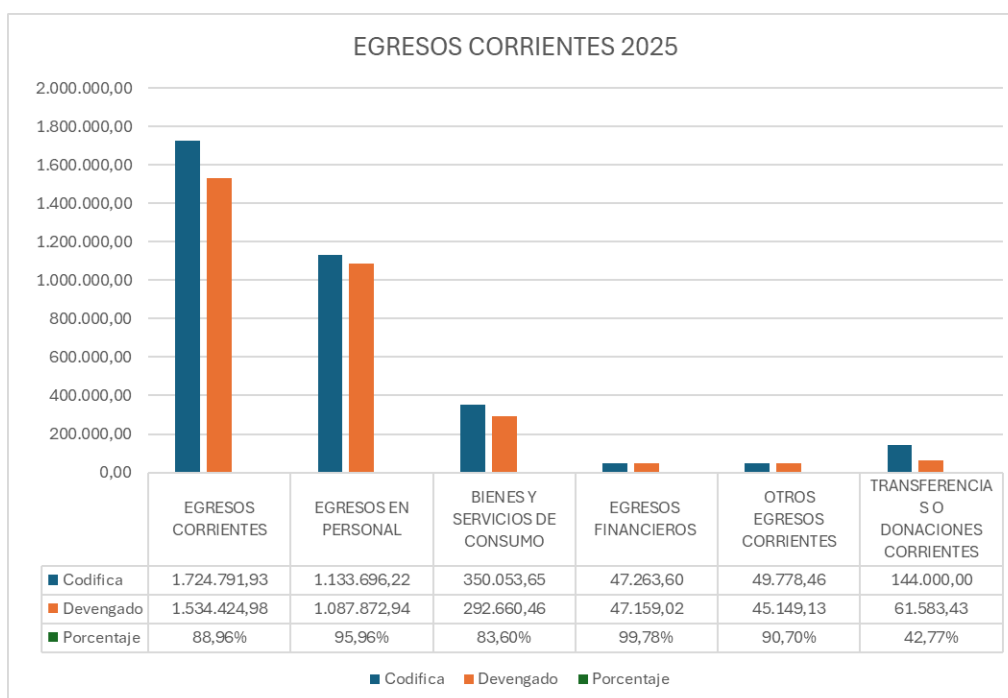

La ejecución presupuestaria de los Egresos Corrientes asciende a USD\$ 1.534.424,98 lo que representa el 88,96% del total codificado, que alcanza los USD\$ 1.724.791,93, y cuya composición es la siguiente:

En el grupo 51, se registran los Egresos por Concepto del Personal, y que está integrado por los conceptos de remuneraciones y beneficios de ley del área administrativa ascienden a USD\$ 1.087.872,94, lo que representa el 95.96% del total codificado, que alcanza los USD\$ 1.133.696,22.

En el grupo 53, se registran los Egresos por Concepto de Bienes y Servicios de Consumo que ascienden a USD\$ 292.660,46, lo que representa el 83.60% del total codificado, que alcanza los USD\$ 350.053,65.

En este grupo se encuentran los servicios básicos, servicios generales, instalación, mantenimiento y reparación, arriendos de bienes, contratación de estudios, investigaciones y servicios técnicos, egresos en informática, bienes de

uso y consumo corriente, bienes muebles no depreciables, viáticos y subsistencias, así como compra de materiales de diferente índole, etc.

El grupo 56 correspondiente a Egresos Financieros la ejecución presupuestaria es de USD\$ 35.181,849 los que representa el 88,90% del total codificado, que alcanza los USD\$ 35.574,17.

El grupo 57 correspondiente a Otros Egresos Corrientes la ejecución presupuestaria es de USD\$ 39.531,22 lo que representa el 88.50% del total codificado, que alcanza los USD\$ 44.641,48.


En esta partida se encuentran los gastos de seguros, impuestos, tasas y contribuciones.

El grupo 58 en el que se registra el aporte del cinco por mil para servicios de la Contraloría General del Estado (CGE). La ejecución presupuestaria asciende a USD\$ 75.547,84 lo que representa el 80.37% del total codificado, que alcanza los USD\$ 94.000,00

Este aporte se calcula sobre la base de los ingresos ejecutados y que son debitados mensualmente de manera automática por el Banco Central del Ecuador (BCE) de las cuentas respectivas que la empresa mantiene en la entidad.

4.1.17. EGRESOS DE PRODUCCIÓN:

Código	Nombre	Codifica	Devengado	Porcentaje
6	EGRESOS DE PRODUCCION	10.515.224,81	7.578.067,53	72,07%
61	EGRESOS EN PERSONAL PARA LA PRODUCCION	2.530.978,73	2.349.734,53	92,84%
63	BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCION	7.870.072,97	5.118.486,46	65,04%
67	OTROS EGRESOS DE PRODUCCION	114.173,11	109.846,54	96,21%

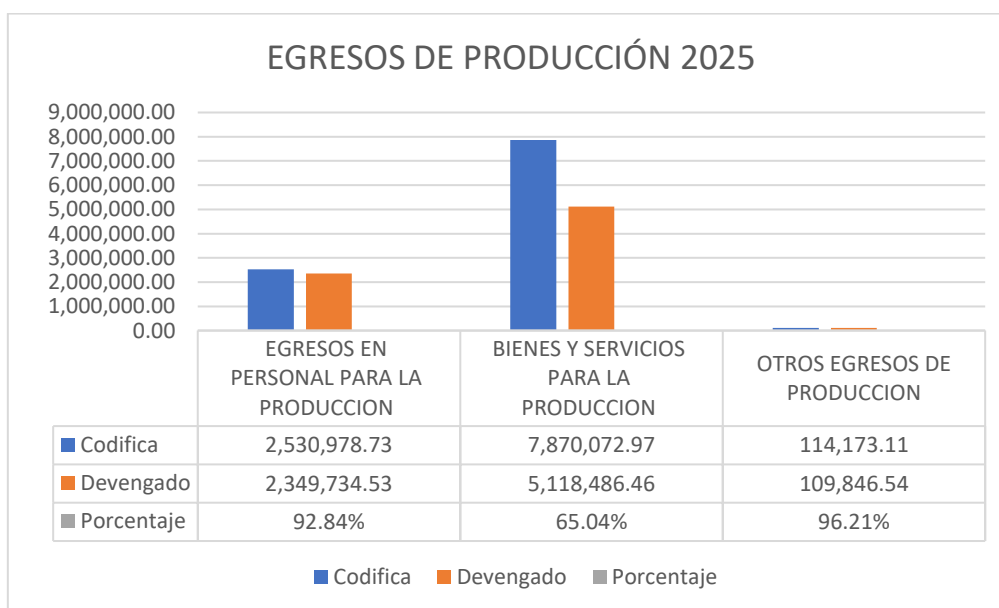

La ejecución presupuestaria de los Egresos de Producción asciende hasta los USD\$ 7.578.067,53, lo que corresponde al 72.07%, de un total codificado, que alcanza los USD\$ 10.515.224,81; de acuerdo, con el siguiente detalle:

En el grupo 61 Egresos de Personal Operativo la ejecución presupuestaria asciende a USD\$ 2.349.734,53, lo que equivale al 92.84% del total codificado, que alcanza los USD\$ 2.530.978,73.


En el grupo 63 Bienes y Servicios Para la Producción la ejecución presupuestaria asciende a USD\$ 5.118.486,46, lo que equivale al 65.04% del total codificado, que alcanza los USD\$ 7.870.072,97.

En este grupo se registran los gastos de servicios básicos, servicios generales, instalación, mantenimiento y reparación, arriendos de bienes, contratación de estudios, investigaciones y servicios técnicos, egresos en informática, bienes de uso y consumo corriente, adquisición de materias primas, adquisición de productos en proceso o semi elaborados, bienes muebles no depreciables, bienes biológicos no depreciables.

En el grupo 67 Otros Egresos de Producción la ejecución presupuestaria asciende a USD\$ 109.846,54, lo que representa el 96.21% del total codificado, que alcanza los USD\$ 114.173,11 y está integrada por Impuestos, tasas y contribuciones, seguros, costos financieros y otros egresos.

4.1.18. EGRESOS DE CAPITAL


Código	Nombre	Codifica	Devengado	Porcentaje
8	EGRESOS DE CAPITAL	56.296,61	46.644,13	82,85%
84	BIENES DE LARGA DURACION (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	56.296,61	46.644,13	82,85%

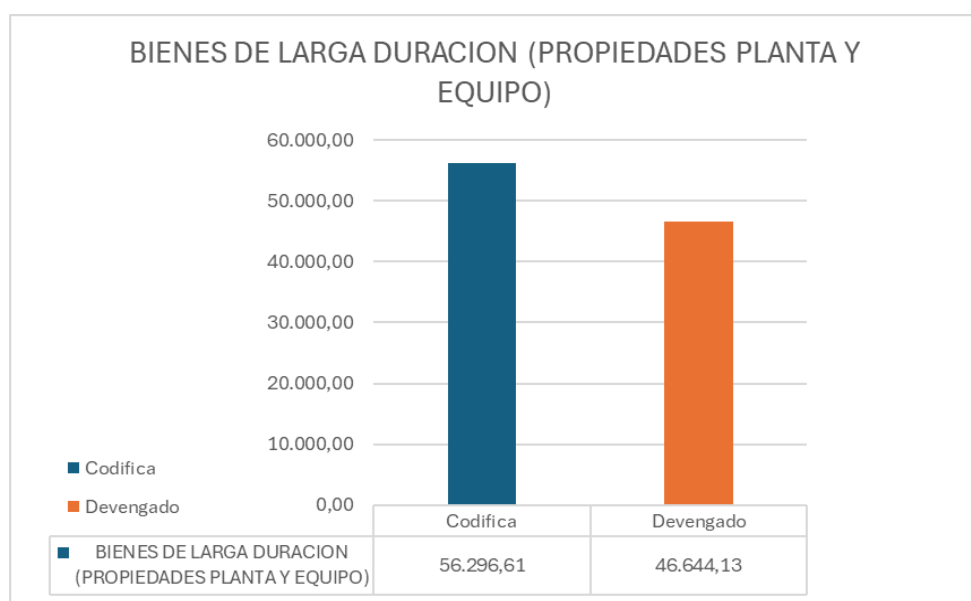

El grupo 84, Bienes de Larga Duración, incluye propiedades plana y equipo y cuya ejecución presupuestaria es de USD\$ 46.644,13, lo que representa el 82.85% del total codificado, que alcanza los USD\$ \$56.296,61.

4.1.19. APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO

Código	Nombre	Codifica	Devengado	Porcentaje
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	40.001,00	14.516,96	36,29%
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	0%
97	PASIVO CIRCULANTE	10.000,00	0,00	0%
99	OTROS PASIVOS	30.001,00	14.516,96	48,39%

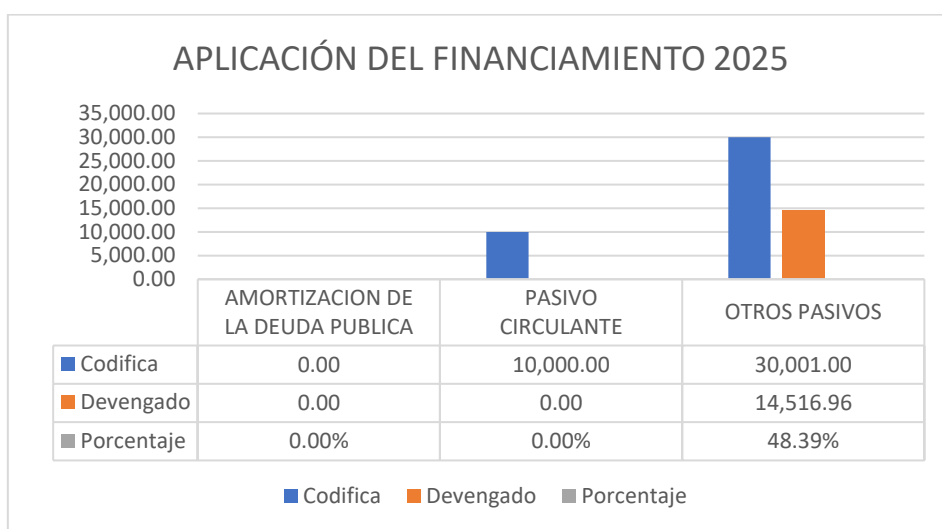

Con respecto al Grupo 9 integrada por Otros Pasivos la ejecución presupuestaria asciende a USD\$ 14.516,96, lo que representa el 48.39% del total codificado, que alcanza los USD \$40.001,00 por concepto de pago de obligaciones de ejercicios anteriores por egresos de personal.

4.1.20. COMPARATIVO INGRESOS CONTRA GASTOS DEVENGADOS

CONCEPTO	DEVENGADO	EJECUCIÓN
TOTAL INGRESOS DEVENGADOS	\$ 9.512.121,23	77,11%
TOTAL GASTOS DEVENGADOS	\$ 9.173.653,60	74,36%

Una vez realizada la evaluación de la ejecución presupuestaria, se determina una diferencia porcentual del 2,75 % positiva entre los ingresos y los gastos.

En cuanto a los ingresos, se registra un monto devengado de USD\$ 9.512.121,23, que corresponde a una ejecución del 77,11%; mientras que, en los gastos, se alcanza un monto devengado de USD\$ 9.173.653,60, equivalente al 74,36% de ejecución.

Estos resultados evidencian que la gestión de la empresa se encuentra principalmente orientada a la generación de ingresos del grupo 14, es decir, a la venta de bienes y servicios, lo que ratifica la coherencia entre su operación y su naturaleza institucional.

El saldo positivo entre ingresos y gastos refleja un manejo presupuestario equilibrado, sustentado en una adecuada relación entre los recursos generados y los ejecutados, así como una gestión eficiente orientada al uso responsable de los fondos públicos, pese a las dificultades técnicas, operativas y coyunturales del país.

El resultado del ejercicio fiscal 2025 consolida una gestión financiera responsable y sostenible, que fortalece la capacidad operativa de la empresa y sienta bases sólidas para la continuidad de sus proyectos y su contribución al desarrollo óproductivo del país.

4.1.21. ESTADO DE RESULTADOS PERIODO 2025

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	2025
4.01	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	9,002,132.46
4.01.01	VENTA DE BIENES	799,566.70
4.01.01.01	PRODUCTOS MINEROS	799,566.70
4.01.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,363,512.97
4.01.02.01	ADMINISTRACIÓN DE PEAJES	1,363,512.97
4.01.03	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	6,715,608.79
4.01.03.01	SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS	6,715,608.79
4.01.04	ARRENDAMIENTOS	123,444.00
4.01.04.01	RENTAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	123,444.00
5.01	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	7,143,397.61
5.01.01	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	7,143,397.61
5.01.01.01	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	7,143,397.61
	GANANCIA BRUTA	1,858,734.85
5.02	GASTOS	1,396,293.66
5.02.01	GASTOS DE GESTION	1,396,293.66
5.02.01.01	REMUNERACIONES	1,087,872.94
5.02.01.02	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	308,420.72
	UTILIDAD OPERACIONAL	462,441.19
4.02.01	OTROS INGRESOS	131,815.11
4.02.01.01	OTROS INGRESOS	124,644.45
4.02.01.02	REVERSION DE PROVISIONES	7,170.66
5.02.02	GASTOS FINANCIEROS	90,633.85
5.02.02.01	SEGUROS Y COSTOS FINANCIEROS	90,633.85
5.02.03	OTROS GASTOS	337,198.62
5.02.03.01	OTROS GASTOS	337,198.62
	RESULTADO DEL PERIODO	166,423.83



El análisis del estado de resultados muestra que los ingresos por la venta de bienes y servicios alcanzaron un total de **USD\$ 7.515.175,49**, consolidándose como la principal fuente de recursos operativos de la empresa y reflejando su capacidad técnica para la ejecución de obras y la provisión de materiales asfálticos en la región.

El costo de ventas y producción ascendió a **USD\$ 7.143.397,61**, equivalente al **95,05 %** de los ingresos operativos, lo cual responde a la naturaleza propia del sector vial, la empresa logró generar una ganancia bruta de USD\$ 371.777,88, equivalente al 4,95% sobre las ventas.

Como resultado de esta gestión integral, el resultado del período fue positivo, alcanzando los **USD\$ 166.423,83**, lo que representa una rentabilidad neta del **2,21%** sobre las ventas. Si bien este margen refleja un entorno operativo exigente, también evidencia la capacidad de la empresa para sostener su operación y cumplir con su rol institucional.

Este resultado demuestra que la empresa mantiene su sostenibilidad financiera, apoyada en una gestión responsable que combina eficiencia operativa, respaldo institucional y control financiero.

Finalmente, se identificaron oportunidades de mejora mediante la optimización de los costos, fortalecimiento de la gestión comercial y la diversificación de las fuentes de ingresos, con el fin de consolidar la autosostenibilidad.



4.2. GESTIÓN TÉCNICA

4.2.1. PROYECTOS DE MEJORAMIENTO VIAL

Prestar servicios de mejoramiento vial al público en general, mejorando la infraestructura vial utilizando los recursos de personal, equipo, materiales y fondos de la manera más efectiva y eficiente posible permitiendo una circulación más segura, cómoda y fluida.

4.2.2. PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

- **Mantenimiento Vial**
 - Mantenimiento rutinario, periódico y de emergencia (vías por delegación)
 - Bacheo o recapeo a nivel de carpeta asfáltica
- **Mejoramiento Vial**
 - **Mejoramiento Geométrico:** Ampliación de calzada, Rectificación de curvas peligrosas, Corrección de pendientes longitudinales y transversales, y Mejoramiento de intersecciones y aproches.
 - **Reforzamiento Estructural:** Reciclaje o estabilización de suelos con cemento
 - **Señalización y Seguridad vial:** Señalización horizontal y vertical, Construcción de elementos de seguridad vial, Iluminación.
 - Doble Tratamiento Superficial Bituminoso
 - Carpeta asfáltica
- **Regeneración Urbana y Parques**
- **Gestión y operación del Sistema Provincial de Peajes**
- **Producción de agregados pétreos y mezcla asfáltica en caliente**

4.2.3. BENEFICIARIOS

NRO.	CONTRATO	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
182-DPS-2024	“CONTRATACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES ALEDAÑAS AL CENTRO DE ABASTO Y PARQUE CENTRAL; Y ENCAUSAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DEL TALUD ADYACENTE A LA QUEBRADA DE LA PARROQUIA SUMAYPAMBA DEL CANTÓN SARAGURO”.	724	790	1514

NRO.	CONTRATO	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
	CONTRATO COMPLEMENTARIO “CONTRATACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES ALEDAÑAS AL CENTRO DE ABASTO Y PARQUE CENTRAL; Y ENCAUSAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DEL TALUD ADYACENTE A LA QUEBRADA DE LA PARROQUIA SUMAYPAMBA DEL CANTÓN SARAGURO”.			
42-2024	“COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y SEÑALIZACIÓN DEL TRAMO VIAL: CALLE HONORATO VASQUEZ – LAGUNA DE BUSA , EN UNA LONGITUD DE 1,6 KM. INCLUIDO PARQUEADERO, UBICADO EN EL CANTÓN SAN FERNANDO - PROVINCIA DEL AZUAY”	1324	1661	2985
	CONTRATO COMPLEMENTARIO “COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y SEÑALIZACIÓN DEL TRAMO VIAL: CALLE HONORATO VASQUEZ – LAGUNA DE BUSA , EN UNA LONGITUD DE 1,6 KM. INCLUIDO PARQUEADERO, UBICADO EN EL CANTÓN SAN FERNANDO - PROVINCIA DEL AZUAY”			
61-2024	"COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y BORDILLOS, Y SEÑALIZACIÓN DEL TRAMO VIAL: PILANCON - SAN SALVADOR DE CAÑARIBAMBA, EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 4.4 KM”	5900	6128	12028
RE-CEP-GADPR-TURI-2024-001	CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO “MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA PUNTA CORRAL 5 ESQUINAS CORAZÓN DE JESÚS , TRAMO 1 0+000 1+000”	480	590	1070
62-2024	MANTENIMIENTO DE LA VÍA SANTA ANA – SAN BARTOLOMÉ , EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 13.6 KM, UBICADA EN LA PARROQUIA DE SANTA ANA DEL CANTÓN CUENCA	2350	2500	4850
RE-CEP-RICAURTE-2024-01	MANTENIMIENTO A NIVEL DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO DE LA VÍA DEL BARRIO LOS CIPRESES DE LA PARROQUIA RICAURTE , CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY	297	373	670
77-2024	“COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LAS VÍAS CALLE MIGUEL BARZALLO, CALLE CORNELIO MOSQUERA, CALLE FRANCISCO PIZZARO Y CALLE BARRIO PLAZAPAMBA, Y MANTENIMIENTO EN LA VÍAS HUAYNA CAPAC E INDIAPAU, CANTÓN PAUTE , PROVINCIAL DEL AZUAY”	5490	5710	11200
75-2024	COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PARA LA VÍA DESDE LA IGLESIA DE ALLPAPANA HASTA LA VÍA PRINCIPAL LA UNIÓN DE CHORDELEG, PARROQUIA LA UNIÓN, CANTÓN CHORDELEG, PROVINCIA DEL AZUAY”	456	512	968
	CONTRATO COMPLEMENTARIO COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PARA LA VÍA DESDE LA IGLESIA DE ALLPAPANA HASTA LA VÍA PRINCIPAL LA UNIÓN DE CHORDELEG, PARROQUIA LA UNIÓN, CANTÓN CHORDELEG, PROVINCIA DEL AZUAY”			



NRO.	CONTRATO	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
92-2024	MANTENIMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL CENTRO PARROQUIAL DE SIMÓN BOLÍVAR , EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 4.23 KM, UBICADA EN LA PARROQUIA DE SIMÓN BOLÍVAR DEL CANTÓN GUALACEO, PROVINCIA DEL AZUAY.	800	860	1660
	CONTRATO COMPLEMENTARIO MANTENIMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL CENTRO PARROQUIAL DE SIMÓN BOLÍVAR , EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 4.23 KM, UBICADA EN LA PARROQUIA DE SIMÓN BOLÍVAR DEL CANTÓN GUALACEO, PROVINCIA DEL AZUAY.			
93-2024	MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE EL RECAPEO CON CARPETA ASFÁLTICA DE 3", EN LA VÍA PRINCIPAL PUENTE ULISES - QUINGEO, TRAMO CASA DE LOS RETIROS COLEGIO .BORJA - ACCESO A COLEGIO DEL MILENIO EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 1 KM, UBICADA EN LA PARROQUIA QUINGE	3183	3971	7154
RE-CEP-GADMSI-2024-01	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN DIFERENTES TRAMOS VIALES DEL CENTRO URBANO DEL CANTON SANTA ISABEL , PROVINCIA DEL AZUAY	4933	5477	10410
94-2024	MANTENIMIENTO DE LA VÍA LUIS CORDERO – DANIEL CÓRDOVA – MARIANO MORENO, EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 9.2 KM, UBICADA EN EL CANTÓN GUALACEO, PROVINCIA DEL AZUAY	1800	1500	3300
002-2025	MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DEL TRAMO VIAL: VÍA DE ACCESO A MINA DE LLATCÓN , EN UNA LONGITUD DE 1.9 KM	2107	2217	4324
	CONTRATO COMPLEMENTARIO MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DEL TRAMO VIAL: VÍA DE ACCESO A MINA DE LLATCÓN , EN UNA LONGITUD DE 1.9 KM			
109-2024	MEJORAMIENTO A NIVEL DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO DEL TRAMO VIAL: PUENTE VIOLA – "Y" DE SAN JOSE DE RARANGA, ENTRE LAS ABCISAS 2+400 A LA 3+300	1200	1200	2400
01-2025	MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA VÍA CAÑARIBAMBA- SHAGLLI , TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS ABCISAS 20+000 A 21+000, UBICADO EN LA PARROQUIA SHAGLLI, CANTÓN SANTA ISABEL, DE LA PROVINCIA DEL AZUAY	1038	1196	2234
07-2025	MEJORAMIENTO DE LA VIA CUMBE – SAN JOSE DE RARANGA, TRAMO: FLORESTA – Y QUINGEO , EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 2.8 KM, UBICADO EN LA PARROQUIA CUMBE DEL CANTON CUENCA DE LA PROVINCIA DEL AZUAY	1200	1200	2400

NRO.	CONTRATO	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
08-2025	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL TRAMO DE VÍA: ESTACIÓN DE CUMBE – RED VIAL ESTATAL E 35 (SECTOR LA MERCED) EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 1.2 KM , UBICADA EN LA PARROQUIA VICTORIA DEL PORTETE, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY	620	668	1288
	CONTRATO COMPLEMENTARIO MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL TRAMO DE VÍA: ESTACIÓN DE CUMBE – RED VIAL ESTATAL E 35 (SECTOR LA MERCED) EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 1.2 KM , UBICADA EN LA PARROQUIA VICTORIA DEL PORTETE, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY			
20-2025	MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA VÍA SAN JOSÉ – DORA CANELOS – OCHOA LEÓN EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 0.84 KM, PARROQUIA SIDCAY, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY	260	423	683
12--2025	“MEJORAMIENTO DE LA VÍA CHINGUILANCHI-AMABLE MARÍA DEL CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA”,	4780	5215	9995
24-2025	“MEJORAMIENTO VIAL: GRUTA DE LA VICTORIA BAJA-VICTORIA CENTRO - Y DE SANTA MARTHA EN UNA LONGITUD DE 2.40 KM, PARROQUIA EL VALLE, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY”	1200	1200	2400
	CONTRATO COMPLEMENTARIO “MEJORAMIENTO VIAL: GRUTA DE LA VICTORIA BAJA-VICTORIA CENTRO - Y DE SANTA MARTHA EN UNA LONGITUD DE 2.40 KM, PARROQUIA EL VALLE, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY”			
23-2025	PROYECTO DE ASFALTADO DE LA VÍA PICOTACUCHO -BUENOS AIRES UBICADA DENTRO DE LA PARROQUIA DE SAYAUSÍ.	200	205	405
	CONTRATO COMPLEMENTARIO PROYECTO DE ASFALTADO DE LA VÍA PICOTACUCHO -BUENOS AIRES UBICADA DENTRO DE LA PARROQUIA DE SAYAUSÍ.			
21-2025	“MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA VÍA TOMBAMBA – GUARAINAG , TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS ABSCISAS 10+700 A 12+430, UBICADO EN LA PARROQUIA TOMBAMBA, CANTON PAUTE, PROVINCIA DEL AZUAY	93	156	249
22-2025	“MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA VÍA ANTIGUA CUENCA – GIRÓN – PASAJE EN UNA LONGITUD DE 7.00 KM EN LA PARROQUIA VICTORIA DEL PORTETE , CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY ETAPA I	520	730	1250



NRO.	CONTRATO	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
	CONTRATO COMPLEMENTARIO “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA VÍA ANTIGUA CUENCA – GIRÓN – PASAJE EN UNA LONGITUD DE 7.00 KM EN LA PARROQUIA VICTORIA DEL PORTETE , CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY ETAPA I			
RE-CEP-GADPRBC-2025-001	“CONSTRUCCION DEL PARQUE LA CUADRA ”.	6800	8000	14800
	CONTRATO COMPLEMENTARIO 1 CONSTRUCCION DEL PARQUE LA CUADRA			
	CONTRATO COMPLEMENTARIO 2 CONSTRUCCION DEL PARQUE LA CUADRA			
Nro. 002-2025-RE-CP	“MANTENIMIENTO VIAL Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE AZOGUES ”	65	80	145
RE-CEP-RICAURTE-2025-01	MANTENIMIENTO A NIVEL DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO DE LA VÍA DEL BARRIO MOLINOPAMBA BAJO (SECTOR LAS BOTELLAS) DE LA PARROQUIA RICAURTE , CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY	409	486	895
	CONTRATO COMPLEMENTARIO MANTENIMIENTO A NIVEL DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO DE LA VÍA DEL BARRIO MOLINOPAMBA BAJO (SECTOR LAS BOTELLAS) DE LA PARROQUIA RICAURTE , CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY			
49-2025	MEJORAMIENTO DE UN TRAMO DE LA VÍA RUMIHURCO - BELLAVISTA, CON UNA LONGITUD DE 240 METROS,	804	690	1494
47-2025	INTERVENCIÓN VIAL EN LAS CALLES CENTRALES DEL CANTÓN NABÓN , PROVINCIAL DEL AZUAY	550	726	1276
50-2025	“MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE LAS VÍAS: ANTONIO FLOR TRAMO 1, ANTONIO FLOR TRAMO 2, ARTURO SANDEZ, AV. CUENCA, JORGE ARAUJO Y JULIO CALLE; CANTÓN GIRÓN , PROVINCIA DE AZUAY”	5532	6650	12182




NRO.	CONTRATO	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
003-DCPYA-2025	"MEJORAMIENTO VIAL DE VARIAS VÍAS DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR ETAPA 5"	3310	4320	7630
54-2025	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA PARA EL TRAMO IGLESIA CRISTO DEL CONSUELO 1+000 - OCTAVIO CORDERO , PROVINCIA DEL AZUAY	538	612	1150
	CONTRATO COMPLEMENTARIO MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA PARA EL TRAMO IGLESIA CRISTO DEL CONSUELO 1+000 - OCTAVIO CORDERO , PROVINCIA DEL AZUAY			
001-RE-A-2025	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA VÍA PARIG , UBICADA DENTRO DEL CANTÓN GUACHAPALA, PROVINCIA DEL AZUAY	56	68	124
	CONTRATO COMPLEMENTARIO MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA VÍA PARIG , UBICADA DENTRO DEL CANTÓN GUACHAPALA, PROVINCIA DEL AZUAY			
RE-CEP-GADMC-G-2025-01	READECUACIÓN A NIVEL ASFÁLTICO DE LAS CAMINERAS DEL PARQUE LINEAL ENTRE EL PUENTE VELAZCO. GUALACEO	1800	1500	3300
58-2025	"MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA PARA LA VÍA 5 ESQUINAS – CORAZON DE JESUS SUBTRAMO: 1+000- 1+500, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY".	85	100	185
RE-CEP-GADPS-2025-002	"MANTENIMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA Y EMBAULADO DEL ARROYO DE AGUA EN LA VÍA A BELLAVISTA" SAYAUSÍ	600	540	1140
	CONTRATO COMPLEMENTARIO "MANTENIMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA Y EMBAULADO DEL ARROYO DE AGUA EN LA VÍA A BELLAVISTA" SAYAUSI			
RE-CEP-GADCUMBE-2025-00002	"EJECUCION DEL PLAN ESPECIAL DE MEJORAMIENTO VIAL DEL CENTRO URBANO PARROQUIAL DE CUMBE, EN LA CALLE IGNACIO DOMINGUEZ. "	200	200	400
012-2025-RE-CP	INTERVENCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE BASE Y RENOVACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN LAS CALLES JUAN MONTALVO Y ELOY ALFARO	65	80	145



NRO.	CONTRATO	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
RE-CEP-GADRCT-2025-0001	“CONTRATACIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL PARQUE CENTRAL DE LA PARROQUIA REMIGIO CRESPO TORAL ”.	600	540	1140
RE-CEP-GADQ-2025-00001	“CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, BORDILLOS Y VEREDAS EN LA PARROQUIA DE QUINGEO DEL CANTON CUENCA ”	237	263	500

TOTAL DE BENEFICIARIOS		
HOMBRES	MUJERES	TOTAL
62.606	69.337	131.943

BENEFICIARIOS POR PROVINCIA	%TOTAL
AZUAY	85,27%
CAÑAR	6,00%
LOJA	8,73%

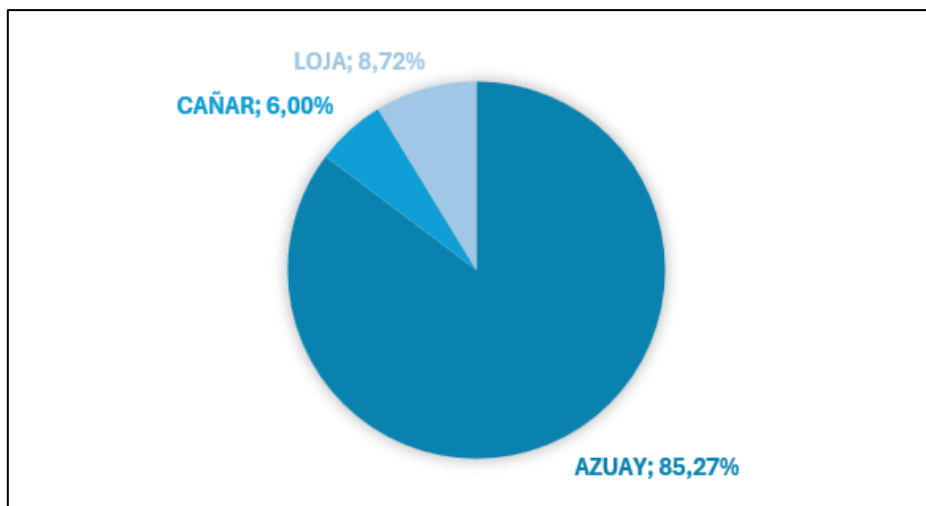

4.2.4. RESULTADOS ALCANZADOS

DETALLE	2023	2024	2025
# DE CONTRATOS	18	23	57
LONGITUD EJECUTADA (Km)	54,94	86,96	40,72

Durante el año 2024 se registró un mayor número de kilómetros ejecutados; sin embargo, este resultado responde a la priorización de intervenciones de bacheo, las cuales constituyen un proceso más sencillo, de menor costo y con tiempos de ejecución más cortos.

Por el contrario, en el año 2025 se priorizó la ejecución de carpeta asfáltica con el propósito de fortalecer de manera integral la infraestructura vial.

Este objetivo responde a la necesidad de construir vías de mayor calidad, durabilidad y vida útil, que permitan no solo atender necesidades inmediatas, sino también generar soluciones sostenibles en el tiempo.

4.2.5. ACTIVIDADES REALIZADAS

En el año 2025, se contemplaron 57 contratos lo que representa un total de 40.72 km de vías intervenidas con entidades públicas y privadas.

Estos contratos incluyeron intervenciones como bacheo y/o recapeo asfáltico, colocación de capas granulares y estabilizadas para estructura de pavimento, colocación de capa de rodadura de mezcla asfáltica en caliente, construcción de obras de drenaje y subdrenaje vial, así como también de redes de alcantarillado, agua potable y domiciliarias, muros, veredas y bordillos, señalización horizontal y vertical, entre otras obras.

4.2.6. AVANCE FINANCIERO

En lo que corresponde a los servicios y proyectos ejecutados por la Gerencia Técnica, se tiene:

AÑO 2023

CODIFICADO INICIAL	DEVENGADO 2023	% DE AVANCE
USD\$ 15.391.930,84	USD\$ 14.206.238,72	92.29%

AÑO 2024

CODIFICADO (REFORMA)	DEVENGADO 2024	% DE AVANCE
USD\$ 18.194.406,72	USD\$ 15.077.164,93	82.87%

AÑO 2025

CODIFICADO (REFORMA)	DEVENGADO 2025	% DE AVANCE
USD. \$12,336,361.85	USD. \$ 9,512,121.23	77.11%

4.2.7. AVANCE ECONÓMICO

NRO.	CONTRATO	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sept-25	oct-25	nov-25	dic-25	Costo + %	Suma de reajustes	Acumulado 2025	% Avance
RE-CEPGADC-2023-23942	“ADQUISICIÓN DE ÁRIDOS PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL CANTÓN CUENCA ”					\$21.580,03									\$0,00	\$567.987,30	100,00%
182-DPS-2024	“CONTRATACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES ALEDAÑAS AL CENTRO DE ABASTO Y PARQUE CENTRAL; Y ENCAUSAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DEL TALUD ADYACENTE A LA QUEBRADA DE LA PARROQUIA SUMAYPAMBA DEL CANTÓN SARAGURO”.	\$27.287,94							\$103.027,82					\$15.154,45	\$459,02	\$383.399,89	99,92%
	CONTRATO COMPLEMENTARIO “CONTRATACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES ALEDAÑAS AL CENTRO DE ABASTO Y PARQUE CENTRAL; Y ENCAUSAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DEL TALUD ADYACENTE A LA QUEBRADA DE LA PARROQUIA SUMAYPAMBA DEL CANTÓN SARAGURO”.								\$18.845,83						\$75,39	\$18.845,83	100,00%



NRO.	CONTRATO	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sept-25	oct-25	nov-25	dic-25	Costo + %	Suma de reajustesg	Acumulado 2025	% Avance
42-2024	"COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y SEÑALIZACIÓN DEL TRAMO VIAL: CALLE HONORATO VASQUEZ – LAGUNA DE BUSA , EN UNA LONGITUD DE 1,6 KM. INCLUIDO PARQUEADERO, UBICADO EN EL CANTÓN SAN FERNANDO - PROVINCIA DEL AZUAY"										\$4.304,03	\$399,66	\$27.557,72		-\$31,62	\$283.210,20	105,00%
	CONTRATO COMPLEMENTARIO "COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y SEÑALIZACIÓN DEL TRAMO VIAL: CALLE HONORATO VASQUEZ – LAGUNA DE BUSA , EN UNA LONGITUD DE 1,6 KM. INCLUIDO PARQUEADERO, UBICADO EN EL CANTÓN SAN FERNANDO - PROVINCIA DEL AZUAY"												\$18.880,68		\$0,00	\$18.880,68	100,00%
61-2024	"COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y BORDILLOS, Y SEÑALIZACIÓN DEL TRAMO VIAL: PILANCON - SAN SALVADOR DE CAÑARIBAMBA, EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 4.4 KM"	\$66.970,09													-\$375,03	\$625.079,00	84,16%
RE-CEP-GADPR-TURI-2024-001	CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO "MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA PUNTA CORRAL 5 ESQUINAS CORAZÓN DE JESÚS , TRAMO 1 0+000 1+000"	\$23.316,66													-\$676,18	\$23.316,66	71,53%

NRO	CONTRATO	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sept-25	oct-25	nov-25	dic-25	Costo + %	Suma de reajustes	Acumulado 2025	% Avance
62-2024	MANTENIMIENTO DE LA VÍA SANTA ANA – SAN BARTOLOMÉ , APROXIMADA DE 13.6 KM, EN LA PARROQUIA DE SANTA ANA DEL CANTÓN CUENCA							\$74.602,43							-\$501,74	\$292.677,91	62,40%
RE-CEP-RICAURTE-2024-01	MANTENIMIENTO A NIVEL DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO DE LA VÍA LOS CIPRESES DE LA PARROQUIA RICAURTE , CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY	\$17.261,56												\$457,42	-\$93,02	\$156.918,41	103,98%
77-2024	“COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LAS VÍAS CALLE MIGUEL BARZALLO, CALLE CORNELIO MOSQUERA, CALLE FRANCISCO PIZZARO Y CALLE BARRIO PLAZAPAMBA, Y MANTENIMIENTO EN LA VÍAS HUAYNA CAPAC E INDIAPAU, CANTÓN PAUTE , PROVINCIAL DEL AZUAY”														\$0,00	\$41.336,79	37,95%
75-2024	COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y OBRAS DE DRENAJE DESDE LA IGLESIA DE ALLPAPANA HASTA LA VÍA PRINCIPAL LA UNIÓN DE CHORDELEG, PARROQUIA LA UNIÓN, CANTÓN CHORDELEG, PROVINCIA DEL AZUAY”	\$7.182,97	\$5.639,00	\$20.285,52				\$22.096,90							-\$150,97	\$105.594,57	93,25%
	CONTRATO COMPLEMENTARIO COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y OBRAS DE DRENAJE DE LA VÍA DESDE LA IGLESIA DE ALLPAPANA HASTA LA VÍA PRINCIPAL LA UNIÓN DE CHORDELEG, PARROQUIA LA UNIÓN, CANTÓN CHORDELEG, PROVINCIA DEL AZUAY”								\$3.439,50						\$0,00	\$3.439,50	67,66%



NRO	CONTRATO	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sept-25	oct-25	nov-25	dic-25	Costo + %	Suma de reajustes	Acumulado 2025	% Avance
92-2024	MANTENIMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL CENTRO PARROQUIAL DE SIMÓN BOLÍVAR , EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 4.23 KM, UBICADA EN LA PARROQUIA DE SIMÓN BOLÍVAR DEL CANTÓN GUALACEO, PROVINCIA DEL AZUAY.						\$100.935,28								\$72,24	\$110.588,69	104,99%
	CONTRATO COMPLEMENTARIO MANTENIMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL CENTRO PARROQUIAL DE SIMÓN BOLÍVAR , EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 4.23 KM, UBICADA EN LA PARROQUIA DE SIMÓN BOLÍVAR DEL CANTÓN GUALACEO, PROVINCIA DEL AZUAY.						\$8.426,44								\$0,00	\$8.426,44	100,00%
93-2024	MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE EL RECAPEO CON CARPETA ASFÁLTICA DE 3", EN LA VÍA PRINCIPAL PUENTE ULISES - QUINGEO, TRAMO CASA DE LOS RETIROS COLEGIO .BORJA - ACCESO A COLEGIO DEL MILENIO EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 1 KM, UBICADA EN LA PARROQUIA QUINGE	\$128.318,15													-\$431,27	\$129.685,26	91,60%
RE-CEP-GADMSI-2024-01	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN DIFERENTES TRAMOS VIALES DEL CENTRO URBANO DEL CANTON SANTA ISABEL , PROVINCIA DEL AZUAY	\$2.668,53								\$114.062,66					-\$18,68	\$204.975,02	103,32%
94-2024	MANTENIMIENTO DE LA VÍA LUIS CORDERO – DANIEL CÓRDOVA – MARIANO MORENO, DE 9.2 KM, UBICADA EN EL CANTÓN GUALACEO, PROVINCIA DEL AZUAY	\$38.996,44	\$69.934,18	\$124.261,50											\$516,45	\$240.117,81	98,23%

NRO	CONTRATO	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sept-25	oct-25	nov-25	dic-25	Costo + %	Suma de reajustes	Acumulado 2025	% Avance
002-2025	MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DEL TRAMO VIAL: VÍA DE ACCESO A MINA DE LLATCÓN , EN UNA LONGITUD DE 1.9 KM					\$44.056,81	\$9.346,21		\$152.434,66	\$456,12					\$614,76	\$206.293,80	99,48%
	CONTRATO COMPLEMENTARIO MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DEL TRAMO VIAL: VÍA DE ACCESO A MINA DE LLATCÓN , EN UNA LONGITUD DE 1.9 KM									\$6.991,94					\$83,90	\$6.991,94	42,55%
109-2024	MEJORAMIENTO A NIVEL DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO DEL TRAMO VIAL: PUENTE VIOLA – "Y" DE SAN JOSE DE RARANGA, ENTRE LAS ABCISAS 2+400 A LA 3+300										\$26.367,20	\$14.108,43			-\$276,38	\$40.475,63	19,72%
01-2025	MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA VÍA CAÑARIBAMBA- SHAGLLI , TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS ABCISAS 20+000 A 21+000, UBICADO EN LA PARROQUIA SHAGLLI, CANTÓN SANTA ISABEL, DE LA PROVINCIA DEL AZUAY												\$124.387,76		\$2.860,92	\$124.387,76	58,25%
07-2025	MEJORAMIENTO DE LA VIA CUMBE – SAN JOSE DE RARANGA, TRAMO: FLORESTA – Y QUINGEO , EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 2.8 KM, UBICADO EN LA PARROQUIA CUMBE DEL CANTON CUENCA DE LA PROVINCIA DEL AZUAY												\$89.415,41		\$1.162,40	\$89.415,41	16,29%

NRO	CONTRATO	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sept-25	oct-25	nov-25	dic-25	Costo + %	Suma de reajustes	Acumulado 2025	% Avance
08-2025	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL TRAMO DE VÍA: ESTACIÓN DE CUMBE – RED VIAL ESTATAL E 35 (SECTOR LA MERCED) EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 1.2 KM , UBICADA EN LA PARROQUIA VICTORIA DEL PORTETE, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY			\$17.368,63	\$33.958,36				\$1.553,38						\$274,21	\$52.880,37	103,03%
	CONTRATO COMPLEMENTARIO MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL TRAMO DE VÍA: ESTACIÓN DE CUMBE – RED VIAL ESTATAL E 35 (SECTOR LA MERCED) EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 1.2 KM , UBICADA EN LA PARROQUIA VICTORIA DEL PORTETE, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY								\$4.102,86							\$7,39	\$4.102,86
20-2025	MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA VÍA SAN JOSÉ – DORA CANELOS – OCHOA LEÓN EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 0.84 KM, PARROQUIA SIDCAY, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY												\$58.929,53		\$677,69	\$58.929,53	37,64%
12--2025	“MEJORAMIENTO DE LA VÍA CHINGUILANCHI-AMABLE MARÍA DEL CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA”,				\$34.276,36	\$83.651,38	\$159.799,96	\$121.753,09	\$79.063,67	\$163.487,59	\$85.420,82	\$100.441,30	\$131.613,92		\$9.488,66	\$959.508,09	87,69%



NRO	CONTRATO	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sept-25	oct-25	nov-25	dic-25	Costo + %	Suma de reajustes	Acumulado 2025	% Avance
24-2025	“MEJORAMIENTO VIAL: GRUTA DE LA VICTORIA BAJA-VICTORIA CENTRO-Y DE SANTA MARTHA EN UNA LONGITUD DE 2.40 KM, PARROQUIA EL VALLE, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY”						\$28.876,80	\$18.212,32	\$30.670,46	\$18.967,11	\$86.078,08	\$2.991,91	\$112.004,19		\$8.731,56	\$297.800,87	105,03%
	CONTRATO COMPLEMENTARIO “MEJORAMIENTO VIAL: GRUTA DE LA VICTORIA BAJA-VICTORIA CENTRO-Y DE SANTA MARTHA EN UNA LONGITUD DE 2.40 KM, PARROQUIA EL VALLE, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY”														\$0,00		
23-2025	PROYECTO DE ASFALTADO DE LA VÍA PICOTACUCHO -BUENOS AIRES UBICADA DENTRO DE LA PARROQUIA DE SAYAUSÍ.			\$3.727,40				\$166.097,21	\$72.557,95	\$67.285,39	\$35.071,17	\$10.106,81	\$75.148,67		\$6.142,49	\$429.994,60	90,12%
	CONTRATO COMPLEMENTARIO PROYECTO DE ASFALTADO DE LA VÍA PICOTACUCHO -BUENOS AIRES UBICADA DENTRO DE LA PARROQUIA DE SAYAUSÍ.											\$849,00	\$5.373,13		-\$128,96	\$6.222,13	100,00%
21-2025	“MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA VÍA TOMBAMBA – GUARAINAG, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS ABSCISAS 10+700 A 12+430, UBICADO EN LA PARROQUIA TOMBAMBA, CANTON PAUTE, PROVINCIA DEL AZUAY									\$149.255,43	\$2.269,46	\$18.470,62	\$7.812,34		\$1.731,45	\$177.807,85	60,48%



NRO	CONTRATO	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sept-25	oct-25	nov-25	dic-25	Costo + %	Suma de reajustes	Acumulado 2025	% Avance
25-2025	MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA VÍA CUTCHIL - LUDO TRAMO: E594 - COMUNIDAD DE SAN ANTONIO EN UNA LONGITUD DE 1,08 KM, UBICADO EN LA PARROQUIA CUTCHIL, CANTÓN SIGSIG, PROVINCIA DEL AZUAY														\$0,00	\$0,00	0,00%
22-2025	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA VÍA ANTIGUA CUENCA – GIRÓN – PASAJE EN UNA LONGITUD DE 7.00 KM EN LA PARROQUIA VICTORIA DEL PORTETE , CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY ETAPA I				\$4.425,36	\$21.773,55	\$18.631,81	\$33.166,58			\$41.228,93	\$10.030,10			-\$495,78	\$129.256,33	26,65%
	CONTRATO COMPLEMENTARIO "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA VÍA ANTIGUA CUENCA – GIRÓN – PASAJE EN UNA LONGITUD DE 7.00 KM EN LA PARROQUIA VICTORIA DEL PORTETE , CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY ETAPA I												\$36.144,22		\$0,00	\$36.144,22	99,71%



NRO.	CONTRATO	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sept-25	oct-25	nov-25	dic-25	Costo + %	Suma de reajustes	Acumulado 2025	% Avance
RE-CEP-GADPRBC-2025-001	"CONSTRUCCION DEL PARQUE LA CUADRA".			\$20.465,94	\$7.659,91	\$94.214,74	\$50.088,12	\$13.012,69	\$52.891,84	\$93.229,21	\$20.309,33	\$155.241,09	\$5.927,12		\$601,29	\$513.039,99	94,95%
	CONTRATO COMPLEMENTARIO 1 CONSTRUCCION DEL PARQUE LA CUADRA				\$6.401,23	\$12.877,28	\$102,70	\$490,25	\$1.500,64	\$5.060,81	\$7.760,55				\$72,22	\$34.193,46	99,84%
	CONTRATO COMPLEMENTARIO 2 CONSTRUCCION DEL PARQUE LA CUADRA											\$8.974,98			\$215,39	\$8.974,98	100,00%
Nro. 002-2025-RE-CP	"MANTENIMIENTO VIAL Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE AZOGUES"				\$141.701,46	\$77.471,98	\$41.277,95								\$269,14	\$260.451,39	105,00%
RE-CEP-RICAURTE-2025-01	MANTENIMIENTO A NIVEL DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO DE LA VÍA DEL BARRIO MOLINOPAMBA BAJO (SECTOR LAS BOTELLAS) DE LA PARROQUIA RICAURTE, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY					\$21.179,60	\$91.902,94	\$11.601,48		\$4.473,86	\$76.183,65				\$1.101,88	\$205.341,53	98,54%
	CONTRATO COMPLEMENTARIO MANTENIMIENTO A NIVEL DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO DE LA VÍA DEL BARRIO MOLINOPAMBA BAJO (SECTOR LAS BOTELLAS) DE LA PARROQUIA RICAURTE, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY										\$9.701,74				\$0,00	\$9.701,74	63,53%
001-2025	CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE ROMPE VELOCIDADES PREDIOS DE LA EMPRESA CORPORACIÓN AZENDE S.A.					\$10.024,04									\$0,00	\$10.024,04	100,00%
004-2025-RE-CP	"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PÉTREOS PARA EL ASFALTADO Y MANTENIMIENTO VIAL DEL CANTÓN AZOGUES"					\$60.180,96	\$88.263,80	\$40.045,91	\$17.584,50	\$16.090,34	\$73.305,40	\$72.868,28	\$26.675,81		\$0,00	\$395.015,00	100,00%

NRO.	CONTRATO	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sept-25	oct-25	nov-25	dic-25	Costo + %	Suma de reajustes	Acumulado 2025	% Avance
49-2025	MEJORAMIENTO DE UN TRAMO DE LA VÍA RUMIHURCO - BELLAVISTA, CON UNA LONGITUD DE 240 METROS,							\$4.726,83	\$18.929,63	\$30.081,57	\$5.445,57		\$233,17		\$378,15	\$59.416,77	99,27%
RE-CEP-GADMSI-2025-01	"ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA (INCLUYE ASFALTO Y RC 250) PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES CENTRALES DEL CANTÓN SANTA ISABEL, PROVINCIA DEL AZUAY",						\$16.064,52								\$0,00	\$16.064,52	100,00%
47-2025	INTERVENCIÓN VIAL EN LAS CALLES CENTRALES DEL CANTÓN NABÓN, PROVINCIAL DEL AZUAY									\$82.267,06					\$470,75	\$82.267,06	82,37%
50-2025	"MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE LAS VÍAS: ANTONIO FLOR TRAMO 1, ANTONIO FLOR TRAMO 2, ARTURO SANDEZ, AV. CUENCA, JORGE ARAUJO Y JULIO CALLE; CANTÓN GIRÓN, PROVINCIA DE AZUAY"							\$27.148,80	\$30.559,80	\$115.490,63					\$523,21	\$173.199,23	43,60%
003-DCPYA-2025	"MEJORAMIENTO VIAL DE VARIAS VÍAS DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR ETAPA 5"									\$9.481,48	\$25.608,89	\$70.669,39	\$265.883,00		\$6.368,84	\$371.642,76	11,61%
54-2025	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA PARA EL TRAMO IGLESIA CRISTO DEL CONSUELO 1+000 - OCTAVIO CORDERO, PROVINCIA DEL AZUAY							\$3.838,42	\$5.077,42	\$30.631,53	\$60.748,79	\$3.382,24			\$674,37	\$103.678,40	100,00%
	CONTRATO COMPLEMENTARIO MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA PARA EL TRAMO IGLESIA CRISTO DEL CONSUELO 1+000 - OCTAVIO CORDERO, PROVINCIA DEL AZUAY										\$5.140,63	\$2.269,37			-\$45,71	\$7.410,00	100,00%

NRO.	CONTRATO	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sept-25	oct-25	nov-25	dic-25	Costo + %	Suma de reajustes	Acumulado 2025	% Avance
001-RE-A-2025	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA VÍA PARIG , UBICADA DENTRO DEL CANTÓN GUACHAPALA, PROVINCIA DEL AZUAY						\$2.569,56	\$3.476,32			\$27.378,66	\$434,15		\$631,52	\$195,76	\$33.858,69	104,93%
	CONTRATO COMPLEMENTARIO MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA VÍA PARIG , UBICADA DENTRO DEL CANTÓN GUACHAPALA, PROVINCIA DEL AZUAY										\$2.565,11				\$0,00	\$2.565,11	99,98%
RECEP-GADMCPA-2025-001	"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA BACHEO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DEL CANTÓN PAUTE "						\$7.345,02		\$4.074,88	\$8.579,66					\$0,00	\$19.999,56	100,00%
RE-CEP-GADMC-G-2025-01	READECUACIÓN A NIVEL ASFÁLTICO DE LAS CAMINERAS DEL PARQUE LINEAL ENTRE EL PUENTE VELAZCO. GUALACEO														\$0,00	\$0,00	0,00%
58-2025	"MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA PARA LA VÍA 5 ESQUINAS – CORAZON DE JESUS SUBTRAMO: 1+000- 1+500, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY".								\$42.287,18	\$28.747,19	\$65.235,66	\$49.494,40	\$25.025,46		\$2.577,54	\$210.789,89	96,95%
76-2025	"SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE AGREGADOS PÉTREOS Y PIEDRA DE ESCOLLERA PARA MANTENIMIENTO Y O MEJORAMIENTO VIAL DE PROYECTOS A EJECUTARSE EN LA CUENCA DEL RÍO PAUTE DE LA PROVINCIA DEL AZUAY DURANTE EL AÑO 2025". ARIDOS GPA								\$84.461,64	\$34.240,48	\$39.949,90	\$41.010,10	\$5.550,16		\$0,00	\$205.212,28	72,92%
75-2025	"ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA Y RC 250 PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A NIVEL DE BACHEO EN DIFERENTES LUGARES DE LA PROVINCIA DEL AZUAY (ETAPA 1)"										\$80.273,28	\$108.916,06	\$49.231,35		\$0,00	\$238.420,69	23,39%

NRO.	CONTRATO	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sept-25	oct-25	nov-25	dic-25	Costo + %	Suma de reajustes	Acumulado 2025	% Avance
RE-CEP-GADPS-2025-002	"MANTENIMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA Y EMBAULADO DEL ARROYO DE AGUA EN LA VÍA A BELLAVISTA" SAYAUSÍ									\$10.087,43	\$23.255,78	\$24.216,15	\$38.679,83		\$1.635,36	\$96.239,19	91,66%
	CONTRATO COMPLEMENTARIO "MANTENIMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA Y EMBAULADO DEL ARROYO DE AGUA EN LA VÍA A BELLAVISTA" SAYAUSI												\$8.383,27		\$142,52	\$8.383,27	100,00%
110-2025	MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE LAS CALLES ANTONIO VILLAVICENCIO, GONZALO CÓRDOVA, Y JESÚS DEL GRAN PODER POTRERILLOS UBICADAS EN EL CANTÓN EL PAN , PROVINCIA DEL AZUAY														\$0,00	\$0,00	0,00%
001-2025	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE INGRESO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA GASOLINERA FIGGAS1 , SECTOR VICTORIA DEL PORTETE"										\$7.900,91				\$0,00	\$7.900,91	115,00%
001-2025	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE INGRESO Y PARQUEADERO A NIVEL DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMI (UTE)														\$0,00	\$0,00	0,00%
002-2025	FIGGAS 2 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE INGRESO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA GASOLINERA FIGGAS1, SECTOR VICTORIA DEL PORTETE"										\$906,69				\$0,00	\$906,69	100,00%
001-2025	BACHEO DEL PARQUEADERO DE LA EMPRESA MULTIPROPOSITO BP									\$5.453,61					\$0,00	\$5.453,61	100,00%
011-2025-RE-CP	ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE MATERIALES PÉTREOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE VARIAS VÍAS DEL CANTÓN AZOGUES												\$6.957,88		\$0,00	\$6.957,88	1,41%

NRO.	CONTRATO	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sept-25	oct-25	nov-25	dic-25	Costo + %	Suma de reajustes	Acumulado 2025	% Avance
010-2025-RE-CP	ALQUILER DE FRESADORA DE ALTA CAPACIDAD PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CANTONAL												\$60.000,00		\$0,00	\$60.000,00	100,00%
RE-CEP-GADCUMBE-2025-00002	"EJECUCION DEL PLAN ESPECIAL DE MEJORAMIENTO VIAL DEL CENTRO URBANO PARROQUIAL DE CUMBE, EN LA CALLE IGNACIO DOMINGUEZ. "												\$64.640,54		\$148.318,00	\$64.640,54	82,51%
RE-CEP-GADPR-TURI-2025-0552	"EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA 5 ESQUINAS - PATAPAMBA A NIVEL DE ESTRUCTURA DE BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO ABCISAS 0+000 A 0+780, INCLUYE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA SOBRE LA QUEBRADA ALFAHUAYCU UBICADA EN LA ABCISA 0+670; Y MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE SUBDRENES, CUNETAS Y BORDILLOS DE LA VIA TRINIDAD PUNTA CORRAL ENTRE LAS ABCISAS 0+000 A 0+440, PARROQUIA TURI , CANTON CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY".														\$0,00		
012-2025-RE-CP	INTERVENCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE BASE Y RENOVACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN LAS CALLES JUAN MONTALVO Y ELOY ALFARO											\$2.824,56	\$31.741,64		\$666,11	\$34.566,20	21,94%



NRO. CONTRATO	CONTRATO	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sept-25	oct-25	nov-25	dic-25	Costo + %	Suma de reajustes	Acumulado 2025	% Avance
RE-CEP-GADRCT-2025-0001	"CONTRATACIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL PARQUE CENTRAL DE LA PARROQUIA REMIGIO CRESPO TORAL ".												\$36.440,56		\$10,59	\$4.072,25	6,21%
120-2025	"MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA VÍA PUENTE RÍO COLLAY (RVE E40) - CALLE PADRE ALBINO DEL CURTO. TRAMOS: PUENTE RIO COLLAY (RVE E40) - RIO URCOCHAGRA, EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 600m (ETAPA I), UBICADO EN EL CANTON SEVILLA DE ORO, PROVINCIA DEL AZUAY"																
RE-CEP-GADQ-2025-00001	"CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, BORDILLOS Y VEREDAS EN LA PARROQUIA DE QUINGEO DEL CANTON CUENCA"												\$562,36				
CONVENIO NRO. 71-2016	PEAJE TURI - TARQUI	\$20.604,38	\$22.679,42	\$23.659,30	\$23.659,30	\$24.120,42	\$25.229,14	\$24.293,34	\$23.889,86	\$24.293,34	\$24.293,34	\$24.293,34	\$13.316,74		\$0,00	\$274.331,92	
	PEAJE ZHUCAY - TUTUPALI	\$22.679,42	\$20.027,98	\$20.604,38	\$21.257,18	\$20.604,38	\$20.258,54	\$20.604,38	\$20.604,38	\$20.604,38	\$23.844,38	\$38.904,86	\$20.364,10		\$0,00	\$270.358,36	
	PEAJE GIRÓN - SAN FERNANDO	\$22.621,78	\$22.804,78	\$23.453,38	\$24.402,58	\$27.353,38	\$27.902,58	\$31.488,81	\$23.716,94	\$26.204,52	\$25.937,45	\$31.930,06	\$25.366,56		\$0,00	\$313.182,82	
	PEAJE LA RAMADA-NABÓN	\$24.189,59	\$24.715,20	\$23.763,05	\$26.993,14	\$24.391,99	\$25.314,58	\$25.974,58	\$23.993,61	\$24.120,42	\$24.178,06	\$22.448,86	\$19.294,41		\$0,00	\$289.377,49	

4.2.8. PRINCIPALES DIFICULTADES

Como principales dificultades durante la ejecución de las obras, se pueden citar los siguientes aspectos:

- **Cambios en la normativa en los procesos de contratación pública**

Durante el período evaluado, los cambios introducidos en la normativa legal vigente generaron afectaciones en los procesos de compras públicas, ocasionando retrasos en la adjudicación y contratación de obras, bienes y servicios necesarios para la ejecución de los proyectos planificados.

Frente a ello, se implementarán las siguientes acciones estratégicas:

1. Fortalecer la planificación anual de contrataciones, incorporando márgenes de tiempo que consideren posibles modificaciones normativas.
2. Capacitar de manera permanente al personal técnico y administrativo en la normativa vigente de contratación pública.
3. Implementar mecanismos de seguimiento y control de los procesos precontractuales y contractuales, a fin de reducir tiempos de respuesta y riesgos de retraso.

- **Afectación por el incendio en la refinería**

El incendio en la Refinería Esmeraldas de Petroecuador ocurrió el 26 de mayo de 2025, causando una interrupción significativa en la producción y abastecimiento de los derivados del petróleo.

Como consecuencia directa para la Empresa ASFALTAR EP el abastecimiento del betún asfáltico AC-20 y RC-250 fue suspendido, provocando restricciones en la disponibilidad de mezcla asfáltica, debiéndose realizar ajustes en los cronogramas de obra y la necesidad de reprogramar actividades constructivas previamente planificadas. El incidente duró alrededor de 3 meses, en los cuales la reactivación fue paulatina, generando retrasos en las obras planificadas y consecuentemente en las metas y objetivos planteados durante el ejercicio fiscal 2025.

Frente a ello, se implementarán las siguientes acciones estratégicas:

1. Optimizar el uso de maquinaria y equipos mediante una programación eficiente de las actividades operativas.
2. Coordinar oportunamente con las entidades competentes para asegurar el suministro de combustibles en escenarios de emergencia.

- **Incremento de costos de insumos y materiales**

Se registró un incremento generalizado en los precios de los combustibles y materiales de construcción, particularmente de los agregados pétreos, debido a los ajustes realizados por los proveedores, lo que incidió en los costos de ejecución y en los presupuestos originalmente aprobados.



Frente a ello, se implementarán las siguientes acciones estratégicas:

1. Realizar análisis periódicos de mercado para anticipar variaciones de precios en insumos críticos.
2. Priorizar el uso eficiente de los recursos y la optimización de materiales en la ejecución de los proyectos.

- **Cierre de la mina La Virginia – Paute**

El GAD Municipal de Paute suspendió temporalmente los permisos de uso de suelo a la Planta de Producción de Áridos La Virginia, ocasionando la paralización de la producción de materiales necesarios para la infraestructura vial, y retrasos en la ejecución de los proyectos ejecutados en coordinación con el GPA.

La suspensión se dio a partir de mediados de junio hasta finales del mes de julio, en donde los proyectos programados para esas fechas fueron suspendidos hasta la solución del problema, ocasionando que las metas trazadas para ese período se desplacen a los siguientes meses del año 2025.

Frente a ello, se implementarán las siguientes acciones estratégicas:

1. Identificar y habilitar fuentes alternativas de abastecimiento de materiales pétreos que cumplan con las especificaciones técnicas requeridas.
2. Coordinar de manera interinstitucional con el Gobierno Provincial del Azuay y otros actores estratégicos para garantizar la continuidad de los proyectos.
3. Actualizar la planificación de obra y los cronogramas de ejecución, considerando las restricciones en la disponibilidad de materiales.
4. En el presente período fiscal (2026) y en conocimiento de la fecha de vigencia del permiso de uso de suelo ibidem expedido hasta el 07 de agosto de 2026, es importante que se realicen las gestiones pertinentes para la renovación del mismo de tal manera que no se generen paralizaciones innecesarias que afectan la ejecución presupuestaria y la viabilidad de los proyectos.



4.2.9. RESUMEN DE CONTRATOS DE OBRA Y/O CONVENIOS

CONTRATOS 2025

NRO	CONTRATO	OBJETO	CONTRATANTE	ESTADO	MONTO CONTRATO	ACUMULADO 2025	% AVANCE
1	RE-CEPGADC-2023-23942	“ADQUISICIÓN DE ÁRIDOS PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL CANTÓN CUENCA ”	GAD CUENCA	FINALIZADO	\$567.987,30	\$567.987,30	100,00%
2	182-DPS-2024	“CONTRATACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES ALEDAÑAS AL CENTRO DE ABASTO Y PARQUE CENTRAL; Y ENCAUSAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DEL TALUD ADYACENTE A LA QUEBRADA DE LA PARROQUIA SUMAYPAMBA DEL CANTÓN SARAGURO”.	GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA	FINALIZADO	\$383.688,68	\$383.399,89	99,92%
		CONTRATO COMPLEMENTARIO “CONTRATACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES ALEDAÑAS AL CENTRO DE ABASTO Y PARQUE CENTRAL; Y ENCAUSAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DEL TALUD ADYACENTE A LA QUEBRADA DE LA PARROQUIA SUMAYPAMBA DEL CANTÓN SARAGURO”.			\$18.845,83	\$18.845,83	100,00%
3	42-2024	“COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y SEÑALIZACIÓN DEL TRAMO VIAL: CALLE HONORATO VASQUEZ – LAGUNA DE BUSA , EN UNA LONGITUD DE 1,6 KM. INCLUIDO PARQUEADERO, UBICADO EN EL CANTÓN SAN FERNANDO - PROVINCIA DEL AZUAY”	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	FINALIZADO	\$269.724,00	\$283.210,20	105,00%
		CONTRATO COMPLEMENTARIO “COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y SEÑALIZACIÓN DEL TRAMO VIAL: CALLE HONORATO VASQUEZ – LAGUNA DE BUSA , EN UNA LONGITUD DE 1,6 KM. INCLUIDO PARQUEADERO, UBICADO EN EL CANTÓN SAN FERNANDO - PROVINCIA DEL AZUAY”			\$18.880,64	\$18.880,68	100,00%
4	61-2024	“COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y BORDILLOS, Y SEÑALIZACIÓN DEL TRAMO VIAL: PILANCON - SAN SALVADOR DE CAÑARIBAMBA, EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 4.4 KM”	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	FINALIZADO	\$742.756,12	\$625.079,00	84,16%
5	RE-CEP-GADPR-TURI-2024-001	CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO “MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA PUNTA CORRAL 5 ESQUINAS CORAZÓN DE JESÚS , TRAMO 1 0+000 1+000”	GAD TURI	FINALIZADO	\$32.597,28	\$23.316,66	71,53%
6	62-2024	MANTENIMIENTO DE LA VÍA SANTA ANA – SAN BARTOLOMÉ , EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 13.6 KM, UBICADA EN LA PARROQUIA DE SANTA ANA DEL CANTÓN CUENCA	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	SUSPENDIDO	\$469.033,78	\$292.677,91	62,40%
7	RE-CEP-RICAURTE-2024-01	MANTENIMIENTO A NIVEL DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO DE LA VÍA DEL BARRIO LOS CIPRESES DE LA PARROQUIA RICAURTE , CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY	GAD RICAURTE	FINALIZADO	\$150.905,09	\$156.918,41	103,98%
8	77-2024	“COLOCACIÓN DE CARPETA ASÁLTICA EN LAS VÍAS CALLE MIGUEL BARZALLO, CALLE CORNELIO MOSQUERA, CALLE FRANCISCO PIZZARO Y CALLE BARRIO PLAZAPAMBA, Y MANTENIMIENTO EN LA VÍAS HUAYNA CAPAC E INDIAPAU, CANTÓN PAUTE , PROVINCIAL DEL AZUAY”	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	SUSPENDIDO	\$108.925,62	\$41.336,79	37,95%
9	75-2024	COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PARA LA VÍA DESDE LA IGLESIA DE ALLPAPANA HASTA LA VÍA PRINCIPAL LA UNIÓN DE CHORDELEG, PARROQUIA LA UNIÓN, CANTÓN CHORDELEG, PROVINCIA DEL AZUAY”	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	FINALIZADO	\$113.243,49	\$105.594,57	93,25%
		CONTRATO COMPLEMENTARIO COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PARA LA VÍA DESDE LA IGLESIA DE ALLPAPANA HASTA LA VÍA PRINCIPAL LA UNIÓN DE CHORDELEG, PARROQUIA LA UNIÓN, CANTÓN CHORDELEG, PROVINCIA DEL AZUAY”	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	FINALIZADO	\$5.083,64	\$3.439,50	67,66%

NRO	CONTRATO	OBJETO	CONTRATANTE	ESTADO	MONTO CONTRATO	ACUMULADO 2025	% AVANCE
9	75-2024	COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PARA LA VÍA DESDE LA IGLESIA DE ALLPAPANA HASTA LA VÍA PRINCIPAL LA UNIÓN DE CHORDELEG, PARROQUIA LA UNIÓN, CANTÓN CHORDELEG, PROVINCIA DEL AZUAY”	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	FINALIZADO	\$113.243,49	\$105.594,57	93,25%
		CONTRATO COMPLEMENTARIO COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PARA LA VÍA DESDE LA IGLESIA DE ALLPAPANA HASTA LA VÍA PRINCIPAL LA UNIÓN DE CHORDELEG, PARROQUIA LA UNIÓN, CANTÓN CHORDELEG, PROVINCIA DEL AZUAY”	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	FINALIZADO	\$5.083,64	\$3.439,50	67,66%
10	92-2024	MANTENIMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL CENTRO PARROQUIAL DE SIMÓN BOLÍVAR , EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 4.23 KM, UBICADA EN LA PARROQUIA DE SIMÓN BOLÍVAR DEL CANTÓN GUALACEO, PROVINCIA DEL AZUAY.	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	FINALIZADO	\$105.332,35	\$110.588,69	104,99%
		CONTRATO COMPLEMENTARIO MANTENIMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL CENTRO PARROQUIAL DE SIMÓN BOLÍVAR , EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 4.23 KM, UBICADA EN LA PARROQUIA DE SIMÓN BOLÍVAR DEL CANTÓN GUALACEO, PROVINCIA DEL AZUAY.			\$8.426,44	\$8.426,44	100,00%
11	93-2024	MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE EL RECAPEO CON CARPETA ASFÁLTICA DE 3", EN LA VÍA PRINCIPAL PUEBLO ULISES - QUINGEO, TRAMO CASA DE LOS RETIROS COLEGIO. BORJA - ACCESO A COLEGIO DEL MILENIO EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 1 KM, UBICADA EN LA PARROQUIA QUINGE	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	FINALIZADO	\$141.584,02	\$129.685,26	91,60%
12	RE-CEP-GADMSI-2024-01	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN DIFERENTES TRAMOS VIALES DEL CENTRO URBANO DEL CANTON SANTA ISABEL , PROVINCIA DEL AZUAY	GAD SANTA ISABEL	FINALIZADO	\$198.397,93	\$204.975,02	103,32%
13	94-2024	MANTENIMIENTO DE LA VÍA LUIS CORDERO – DANIEL CÓRDOVA – MARIANO MORENO, EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 9.2 KM, UBICADA EN EL CANTÓN GUALACEO, PROVINCIA DEL AZUAY	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	FINALIZADO	\$244.443,43	\$240.117,81	98,23%
14	002-2025	MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DEL TRAMO VIAL: VÍA DE ACCESO A MINA DE LLATCÓN , EN UNA LONGITUD DE 1.9 KM	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	FINALIZADO	\$207.373,12	\$206.293,80	99,48%
		CONTRATO COMPLEMENTARIO MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DEL TRAMO VIAL: VÍA DE ACCESO A MINA DE LLATCÓN , EN UNA LONGITUD DE 1.9 KM			\$16.431,15	\$6.991,94	42,55%
15	109-2024	MEJORAMIENTO A NIVEL DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO DEL TRAMO VIAL: PUEBLO VIOLA – "Y" DE SAN JOSE DE RARANGA, ENTRE LAS ABSCISAS 2+400 A LA 3+300	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	SUSPENDIDO	\$205.204,33	\$40.475,63	19,72%
16	01-2025	MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA VÍA CAÑARIBAMBA- SHAGLLI , TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS ABSCISAS 20+000 A 21+000, UBICADO EN LA PARROQUIA SHAGLLI, CANTÓN SANTA ISABEL, DE LA PROVINCIA DEL AZUAY	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	EN EJECUCIÓN	\$213.556,03	\$124.387,76	58,25%
17	07-2025	MEJORAMIENTO DE LA VIA CUMBE – SAN JOSE DE RARANGA, TRAMO: FLORESTA – Y QUINGEO , EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 2.8 KM, UBICADO EN LA PARROQUIA CUMBE DEL CANTON CUENCA DE LA PROVINCIA DEL AZUAY	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	EN EJECUCIÓN	\$548.927,95	\$89.415,41	16,29%
18	08-2025	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL TRAMO DE VÍA: ESTACIÓN DE CUMBE – RED VIAL ESTATAL E 35 (SECTOR LA MERCED) EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 1.2 KM , UBICADA EN LA PARROQUIA VICTORIA DEL PORTETE, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	FINALIZADO	\$51.326,99	\$52.880,37	103,03%
		CONTRATO COMPLEMENTARIO MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL TRAMO DE VÍA: ESTACIÓN DE CUMBE – RED VIAL ESTATAL E 35 (SECTOR LA MERCED) EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 1.2 KM , UBICADA EN LA PARROQUIA VICTORIA DEL PORTETE, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY			\$4.105,86	\$4.102,86	99,93%

NRO	CONTRATO	OBJETO	CONTRATANTE	ESTADO	MONTO CONTRATO	ACUMULADO 2025	% AVANCE
19	20-2025	MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA VÍA SAN JOSÉ – DORA CANELOS – OCHOA LEÓN EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 0.84 KM, PARROQUIA SIDCAY, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	EN EJECUCIÓN	\$156.547,03	\$58.929,53	37,64%
20	12--2025	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA CHINGUILANCHI-AMABLE MARÍA DEL CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA",	GOBIERNO MUNICIPAL LOJA	EN EJECUCIÓN	\$1.094.240,88	\$959.508,09	87,69%
21	24-2025	"MEJORAMIENTO VIAL: GRUTA DE LA VICTORIA BAJA-VICTORIA CENTRO- Y DE SANTA MARTHA EN UNA LONGITUD DE 2.40 KM, PARROQUIA EL VALLE, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY"	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	EN EJECUCIÓN	\$283.528,89	\$297.800,87	105,03%
		CONTRATO COMPLEMENTARIO "MEJORAMIENTO VIAL: GRUTA DE LA VICTORIA BAJA-VICTORIA CENTRO- Y DE SANTA MARTHA EN UNA LONGITUD DE 2.40 KM, PARROQUIA EL VALLE, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY"	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY		\$22.516,66		
22	23-2025	PROYECTO DE ASFALTADO DE LA VÍA PICOTACUCHO -BUENOS AIRES UBICADA DENTRO DE LA PARROQUIA DE SAYAUSÍ.	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	EN EJECUCIÓN	\$477.147,47	\$429.994,60	90,12%
		CONTRATO COMPLEMENTARIO PROYECTO DE ASFALTADO DE LA VÍA PICOTACUCHO -BUENOS AIRES UBICADA DENTRO DE LA PARROQUIA DE SAYAUSÍ.			\$6.222,13	\$6.222,13	100,00%
23	21-2025	"MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA VÍA TOMBAMBA – GUARAINAG, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS ABCISAS 10+700 A 12+430, UBICADO EN LA PARROQUIA TOMBAMBA, CANTON PAUTE, PROVINCIA DEL AZUAY	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	EN EJECUCIÓN	\$294.004,16	\$177.807,85	60,48%
24	25-2025	MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA VÍA CUTCHIL - LUDO TRAMO: E594 - COMUNIDAD DE SAN ANTONIO EN UNA LONGITUD DE 1,08 KM, UBICADO EN LA PARROQUIA CUTCHIL, CANTÓN SIGSIG, PROVINCIA DEL AZUAY	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	SIN INICIO	\$203.986,24	\$0,00	0,00%
25	22-2025	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA VÍA ANTIGUA CUENCA – GIRÓN – PASAJE EN UNA LONGITUD DE 7.00 KM EN LA PARROQUIA VICTORIA DEL PORTETE, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY ETAPA I	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	EN EJECUCIÓN	\$484.957,73	\$129.256,33	26,65%
		CONTRATO COMPLEMENTARIO "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA VÍA ANTIGUA CUENCA – GIRÓN – PASAJE EN UNA LONGITUD DE 7.00 KM EN LA PARROQUIA VICTORIA DEL PORTETE, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY ETAPA I		EN EJECUCIÓN	\$36.249,58	\$36.144,22	99,71%
26	RE-CEP-GADPRBC-2025-001	"CONSTRUCCION DEL PARQUE LA CUADRA".	GAD PARROQUIAL RURAL DE BAÑOS	FINALIZADO	\$540.323,20	\$513.039,99	94,95%
		CONTRATO COMPLEMENTARIO 1 CONSTRUCCION DEL PARQUE LA CUADRA			\$34.248,39	\$34.193,46	99,84%
		CONTRATO COMPLEMENTARIO 2 CONSTRUCCION DEL PARQUE LA CUADRA			\$8.974,98	\$8.974,98	100,00%
27	Nro. 002-2025-RE-CP	"MANTENIMIENTO VIAL Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE AZOGUES"	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES	FINALIZADO	\$248.048,94	\$260.451,39	105,00%
28	RE-CEP-RICAURTE-2025-01	MANTENIMIENTO A NIVEL DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO DE LA VÍA DEL BARRIO MOLINOPAMBA BAJO (SECTOR LAS BOTELLAS) DE LA PARROQUIA RICAURTE, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY	GAD RICAURTE	FINALIZADO	\$208.393,31	\$205.341,53	98,54%
		CONTRATO COMPLEMENTARIO MANTENIMIENTO A NIVEL DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO DE LA VÍA DEL BARRIO MOLINOPAMBA BAJO (SECTOR LAS BOTELLAS) DE LA PARROQUIA RICAURTE, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY			\$15.270,92	\$9.701,74	63,53%
29	001-2025	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ROMPE VELOCIDADES EN PREDIOS DE LA EMPRESA CORPORACIÓN AZENDE S.A.	PRIVADO	FINALIZADO	\$10.024,04	\$10.024,04	100,00%
30	004-2025-RE-CP	"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PÉTREOS PARA EL ASFALTADO Y MANTENIMIENTO VIAL DEL CANTÓN AZOGUES"	GAD AZOGUES	FINALIZADO	\$395.015,00	\$395.015,00	100,00%

NRO	CONTRATO	OBJETO	CONTRATANTE	ESTADO	MONTO CONTRATO	ACUMULADO 2025	% AVANCE
31	49-2025	MEJORAMIENTO DE UN TRAMO DE LA VÍA RUMIHURCO - BELLAVISTA, CON UNA LONGITUD DE 240 METROS,	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	FINALIZADO	\$59.854,32	\$59.416,77	99,27%
32	RE-CEP-GADMSI-2025-01	"ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA (INCLUYE ASFALTO Y RC 250) PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES CENTRALES DEL CANTÓN SANTA ISABEL , PROVINCIA DEL AZUAY",	GAD SANTA ISABEL	FINALIZADO	\$16.064,52	\$16.064,52	100,00%
33	47-2025	INTERVENCIÓN VIAL EN LAS CALLES CENTRALES DEL CANTÓN NABÓN , PROVINCIAL DEL AZUAY	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	FINALIZADO	\$99.871,37	\$82.267,06	82,37%
34	50-2025	"MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE LAS VÍAS: ANTONIO FLOR TRAMO 1, ANTONIO FLOR TRAMO 2, ARTURO SANDEZ, AV. CUENCA, JORGE ARAUJO Y JULIO CALLE; CANTÓN GIRÓN , PROVINCIA DE AZUAY"	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	SUSPENDIDO	\$397.266,22	\$173.199,23	43,60%
35	003-DCPYA-2025	"MEJORAMIENTO VIAL DE VARIAS VÍAS DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR ETAPA 5 "	GOBIERNO PROVINCIAL DEL CAÑAR	EN EJECUCIÓN	\$3.199.942,72	\$371.642,76	11,61%
36	54-2025	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA PARA EL TRAMO IGLESIA CRISTO DEL CONSUELO 1+000 - OCTAVIO CORDERO , PROVINCIA DEL AZUAY	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	FINALIZADO	\$103.683,32	\$103.678,40	100,00%
		CONTRATO COMPLEMENTARIO MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA PARA EL TRAMO IGLESIA CRISTO DEL CONSUELO 1+000 - OCTAVIO CORDERO , PROVINCIA DEL AZUAY			\$7.410,24	\$7.410,00	100,00%
37	001-RE-A-2025	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA VÍA PARIG , UBICADA DENTRO DEL CANTÓN GUACHAPALA, PROVINCIA DEL AZUAY	GAD DE GUACHAPALA	FINALIZADO	\$32.267,35	\$33.858,69	104,93%
		CONTRATO COMPLEMENTARIO MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA VÍA PARIG , UBICADA DENTRO DEL CANTÓN GUACHAPALA, PROVINCIA DEL AZUAY			\$2.565,51	\$2.565,11	99,98%
38	RECEP-GADMCPA-2025-001	"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA BACHEO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DEL CANTÓN PAUTE "	GAD PAUTE	FINALIZADO	\$19.999,56	\$19.999,56	100,00%
39	RE-CEP-GADMC-G-2025-01	READECUACIÓN A NIVEL ASFÁLTICO DE LAS CAMINERAS DEL PARQUE LINEAL ENTRE EL PUENTE VELAZCO. GUALACEO	GAD GUALACEO	SIN INICIO	\$349.962,45	\$0,00	0,00%
40	58-2025	"MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA PARA LA VÍA 5 ESQUINAS – CORAZON DE JESUS SUBTRAMO: 1+000- 1+500, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY".	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	FINALIZADO	\$217.415,07	\$210.789,89	96,95%
41	76-2025	"SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE AGREGADOS PÉTREOS Y PIEDRA DE ESCOLLERA PARA MANTENIMIENTO Y O MEJORAMIENTO VIAL DE PROYECTOS A EJECUTARSE EN LA CUENCA DEL RÍO PAUTE DE LA PROVINCIA DEL AZUAY DURANTE EL AÑO 2025". ARIDOS GPA	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	EN EJECUCIÓN	\$281.406,01	\$205.212,28	72,92%
42	75-2025	"ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA Y RC 250 PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A NIVEL DE BACHEO EN DIFERENTES LUGARES DE LA PROVINCIA DEL AZUAY (ETAPA 1)"	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	EN EJECUCIÓN	\$1.019.288,17	\$238.420,69	23,39%

NRO	CONTRATO	OBJETO	CONTRATANTE	ESTADO	MONTO CONTRATO	ACUMULADO 2025	% AVANCE
43	RE-CEP-GADPS-2025-002	"MANTENIMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA Y EMBAULADO DEL ARROYO DE AGUA EN LA VÍA A BELLAVISTA" SAYAUSÍ	GAD SAYAUSÍ	EN EJECUCIÓN	\$104.992,74	\$96.239,19	91,66%
		CONTRATO COMPLEMENTARIO "MANTENIMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA Y EMBAULADO DEL ARROYO DE AGUA EN LA VÍA A BELLAVISTA" SAYAUSI			\$8.383,27	\$8.383,27	100,00%
44	110-2025	MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE LAS CALLES ANTONIO VILLAVICENCIO, GONZALO CÓRDOVA, Y JESÚS DEL GRAN PODER POTRERILLOS UBICADAS EN EL CANTÓN EL PAN , PROVINCIA DEL AZUAY	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	SIN INICIO	\$121.784,89	\$0,00	0,00%
45	001-2025	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE INGRESO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA GASOLINERA FIGGAS1 , SECTOR VICTORIA DEL PORTETE"	PRIVADO	FINALIZADO	\$6.870,36	\$7.900,91	115,00%
46	001-2025	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE INGRESO Y PARQUEADERO A NIVEL DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMI (UTE)	PRIVADO	SIN INICIO	\$32.318,92	\$0,00	0,00%
47	002-2025	FIGGAS 2 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE INGRESO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA GASOLINERA FIGGAS1, SECTOR VICTORIA DEL PORTETE"	PRIVADO	FINALIZADO	\$906,69	\$906,69	100,00%
48	001-2025	BACHEO DEL PARQUEADERO DE LA EMPRESA MULTIPROPOSITO BP	PRIVADO	FINALIZADO	\$5.453,61	\$5.453,61	100,00%
49	011-2025-RE-CP	ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE MATERIALES PÉTREOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE VARIAS VÍAS DEL CANTÓN AZOGUES	GAD AZOGUES	EN EJECUCIÓN	\$492.061,12	\$6.957,88	1,41%
50	010-2025-RE-CP	ALQUILER DE FRESADORA DE ALTA CAPACIDAD PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CANTONAL	GAD AZOGUES	FINALIZADO	\$60.000,00	\$60.000,00	100,00%
51	RE-CEP-GADCUMBE-2025-00002	"EJECUCION DEL PLAN ESPECIAL DE MEJORAMIENTO VIAL DEL CENTRO URBANO PARROQUIAL DE CUMBE, EN LA CALLE IGNACIO DOMINGUEZ. "	GAD CUMBE	EN EJECUCIÓN	\$78.344,01	\$64.640,54	82,51%
52	RE-CEP-GADPR-TURI-2025-0552	"EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA 5 ESQUINAS - PATAPAMBA A NIVEL DE ESTRUCTURA DE BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO ABSCISAS 0+000 A 0+780, INCLUYE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA SOBRE LA QUEBRADA ALFAHUAYCU UBICADA EN LA ABSCISA 0+670; Y MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE SUBDRENES, CUNETAS Y BORDILLOS DE LA VIA TRINIDAD PUNTA CORRAL ENTRE LAS ABSCISAS 0+000 A 0+440, PARROQUIA TURI , CANTON CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY".	GAD TURI	SIN INICIO	\$541.592,68		
53	012-2025-RE-CP	INTERVENCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE BASE Y RENOVACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN LAS CALLES JUAN MONTALVO Y ELOY ALFARO	GAD AZOGUES	EN EJECUCIÓN	\$157.566,53	\$34.566,20	21,94%
54	RE-CEP-GADRCT-2025-0001	"CONTRATACIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL PARQUE CENTRAL DE LA PARROQUIA REMIGIO CRESPO TORAL ".	GAD RURAL REMIGIO CRESPO	EN EJECUCIÓN	\$65.619,50	\$4.072,25	6,21%
55	120-2025	"MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA VÍA PUENTE RÍO COLLAY (RVE E40) - CALLE PADRE ALBINO DEL CURTO, TRAMOS: PUENTE RIO COLLAY (RVE E40) - RIO URCHOCHAGRA, EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 600m (ETAPA I), UBICADO EN EL CANTON SEVILLA DE ORO, PROVINCIA DEL AZUAY"	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	SIN INICIO	\$291.404,30		
56	RE-CEP-GADQ-2025-00001	"CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, BORDILLOS Y VEREDAS EN LA PARROQUIA DE QUINGEO DEL CANTON CUENCA"	GAD QUINGEO	EN EJECUCIÓN	\$187.636,97		
57	CONVENIO NRO. 71-2016	PEAJE TURI - TARQUI	GPA	EN EJECUCIÓN		\$274.331,92	
		PEAJE ZHUCAY - TUTUPALI				\$270.358,36	
		PEAJE GIRÓN - SAN FERNANDO				\$313.182,82	
		PEAJE LA RAMADA-NABÓN				\$289.377,49	

Estado del proyecto	Nro. de proyectos
En ejecución	18
Suspendido	4
Finalizado	29
Sin inicio	6
Total	57

4.2.10. DETALLE DE CONTRATOS DE OBRA

OBJETO: “MANTENIMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA Y EMBAULADO DEL ARROYO DE AGUA EN LA VÍA A BELLAVISTA”

DATOS			
PROVINCIA:	AZUAY		
CANTÓN:	CUENCA		
PARROQUIA:	SAYAUSI		
MONTO DEL CONTRATO:	\$8.383,27		
LONGITUD INTERVENIDA:	1.2 KM	PLAZO (días):	
RESULTADO OBTENIDOS			
PLANIFICADO	EJECUTADO	% DE AVANCE	
		73,89%	
BENEFICIARIOS			
MUJERES:	540	HOMBRES:	600
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			



OBJETO: "PROYECTO DE ASFALTADO DE LA VÍA PICOTACUCHO -BUENOS AIRES UBICADA DENTRO DE LA PARROQUIA DE SAYAUSÍ".

DATOS			
PROVINCIA:		AZUAY	
CANTÓN:		CUENCA	
PARROQUIA:		SAYAUSI	
MONTO DEL CONTRATO:		6222,13	
LONGITUD INTERVENIDA:	0,9 KM	PLAZO (días):	120 DIAS
RESULTADO OBTENIDOS			
PLANIFICADO		EJECUTADO	% DE AVANCE
			90.12%
BENEFICIARIOS			
MUJERES:	250	HOMBRES:	200
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			



OBJETO: "MANTENIMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL CENTRO PARROQUIAL DE SIMÓN BOLÍVAR, EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 4.23 KM, UBICADA EN LA PARROQUIA DE SIMÓN BOLÍVAR DEL CANTÓN GUALACEO, PROVINCIA DEL AZUAY".

DATOS			
PROVINCIA:		AZUAY	
CANTÓN:		GUALACEO	
PARROQUIA:		SIMON BOLIVAR	
MONTO DEL CONTRATO:		\$ 8.426,44	
LONGITUD INTERVENIDA:	4,23 KM	PLAZO (días):	
RESULTADO OBTENIDOS			
PLANIFICADO		EJECUTADO	% DE AVANCE
BENEFICIARIOS			
MUJERES:	860	HOMBRES:	800
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			



OBJETO: “MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA PARA LA VÍA 5 ESQUINAS – CORAZON DE JESUS SUBTRAMO: 1+000- 1+500, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY”.

DATOS			
PROVINCIA:		AZUAY	
CANTÓN:		CUENCA	
PARROQUIA:		TURI	
MONTO DEL CONTRATO:			
LONGITUD INTERVENIDA: 500 METROS		PLAZO (días):	
RESULTADO OBTENIDOS			
PLANIFICADO		EJECUTADO	% DE AVANCE
BENEFICIARIOS			
MUJERES:	100	HOMBRES:	85
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			



OBJETO: "MANTENIMIENTO DE LA VÍA LUIS CORDERO – DANIEL CÓRDOVA – MARIANO MORENO, EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 9.2 KM, UBICADA EN EL CANTÓN GUALACEO, PROVINCIA DEL AZUAY".

DATOS			
PROVINCIA:		Azuay	
CANTÓN:		Gualaceo	
PARROQUIA:		Daniel Cordoba	
MONTO DEL CONTRATO:		244443,43	
LONGITUD INTERVENIDA:		PLAZO (días):	90
RESULTADO OBTENIDOS			
PLANIFICADO		EJECUTADO	% DE AVANCE
244443,43		243404,36	99,57%
BENEFICIARIOS			
MUJERES:	1500	HOMBRES:	1800
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			



OBJETO: MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA PUNTA CORRAL - 5 ESQUINAS - CORAZÓN DE JESÚS, TRAMO 1: 0+000 – 1+000.

DATOS			
PROVINCIA:	Azuay		
CANTÓN:	Cuenca		
PARROQUIA:	Turi		
MONTO DEL CONTRATO:	\$ 478.865,97		
LONGITUD INTERVENIDA:	PLAZO (días):	90	
RESULTADO OBTENIDOS			
PLANIFICADO	EJECUTADO	% DE AVANCE	
\$ 478.865,97	\$ 431.102,97	90%	
BENEFICIARIOS			
MUJERES:	590	HOMBRES:	480
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			



OBJETO: "CONSTRUCCION DEL PARQUE LA CUADRA".

DATOS			
PROVINCIA:		Azuay	
CANTÓN:		Cuenca	
PARROQUIA:		Baños	
MONTO DEL CONTRATO:		\$ 540.323,20	
LONGITUD INTERVENIDA:		PLAZO (días):	210
RESULTADO OBTENIDOS			
PLANIFICADO		EJECUTADO	% DE AVANCE
\$ 540.323,20		\$ 512.767,80	95%
BENEFICIARIOS			
MUJERES:	8000	HOMBRES:	6800
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			



OBJETO: "MANTENIMIENTO A NIVEL DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO DE LA VÍA DEL BARRIO LOS CIPRESSES DE LA PARROQUIA RICAURTE, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY"

DATOS			
PROVINCIA:		AZUAY	
CANTÓN:		CUENCA	
PARROQUIA:		RICAURTE	
MONTO DEL CONTRATO:		150905,09	
LONGITUD INTERVENIDA:	329,22	PLAZO (días):	
RESULTADO OBTENIDOS			
PLANIFICADO		EJECUTADO	% DE AVANCE
		156898,41	103,97
BENEFICIARIOS			
MUJERES:	373	HOMBRES:	297
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			



OBJETO: "MANTENIMIENTO A NIVEL DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO DE LA VÍA DEL BARRIO MOLINOPAMBA BAJO (SECTOR LAS BOTELLAS) DE LA PARROQUIA RICAURTE, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY"

DATOS			
PROVINCIA:		AZUAY	
CANTÓN:		CUENCA	
PARROQUIA:		RICAURTE	
MONTO DEL CONTRATO:		208393,31	
LONGITUD INTERVENIDA:	700,25	PLAZO (días):	
RESULTADO OBTENIDOS			
PLANIFICADO		EJECUTADO	% DE AVANCE
		208340,07	99,97
BENEFICIARIOS			
MUJERES:	486	HOMBRES:	409
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			



OBJETO: “MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA PARA EL TRAMO IGLESIA CRISTO DEL CONSUELO 1+000 - OCTAVIO CORDERO, PROVINCIA DEL AZUAY”.

DATOS			
PROVINCIA:		AZUAY	
CANTÓN:		CUENCA	
PARROQUIA:		OCTAVIO CORDERO	
MONTO DEL CONTRATO:		103683,32	
LONGITUD INTERVENIDA:	843,18	PLAZO (días):	
RESULTADO OBTENIDOS			
PLANIFICADO		EJECUTADO	% DE AVANCE
		103683,32	100
BENEFICIARIOS			
MUJERES:	612	HOMBRES:	538
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			



OBJETO: "EJECUCION DEL PLAN ESPECIAL DE MEJORAMIENTO VIAL DEL CENTRO URBANO PARROQUIAL DE CUMBE, EN LA CALLE IGNACIO DOMINGUEZ."

DATOS			
PROVINCIA:		AZUAY	
CANTÓN:		CUENCA	
PARROQUIA:		CUMBE	
MONTO DEL CONTRATO:		\$78.344,03	
LONGITUD INTERVENIDA:	0,174KM	PLAZO (días):	45 DÍAS
RESULTADO OBTENIDOS			
PLANIFICADO		EJECUTADO	% DE AVANCE
BENEFICIARIOS			
MUJERES:	200	HOMBRES:	200
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			



OBJETO: “MEJORAMIENTO A NIVEL DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO DEL TRAMO VIAL: PUENTE VIOLA – "Y" DE SAN JOSE DE RARANGA, ENTRE LAS ABCISAS 2+400 A LA 3+300”.

DATOS			
PROVINCIA:		AZUAY	
CANTÓN:		CUENCA	
PARROQUIA:		CUMBE	
MONTO DEL CONTRATO:		\$548.927,95	
LONGITUD INTERVENIDA:	2.8KM	PLAZO (días):	90 DÍAS
RESULTADO OBTENIDOS			
PLANIFICADO		EJECUTADO	% DE AVANCE
BENEFICIARIOS			
MUJERES:	1200	HOMBRES:	1200
REGISTRO FOTOGRÁFICO			



OBJETO: “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA VÍA ANTIGUA CUENCA – GIRÓN – PASAJE EN UNA LONGITUD DE 7.00 KM EN LA PARROQUIA VICTORIA DEL PORTETE, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY ETAPA I”.

DATOS			
PROVINCIA:		AZUAY	
CANTÓN:		CUENCA	
PARROQUIA:		VICTORIA DEL PORTETE	
MONTO DEL CONTRATO:		484957,73	
LONGITUD INTERVENIDA: 3500 M		PLAZO (días):	150
RESULTADO OBTENIDOS			
PLANIFICADO		EJECUTADO	% DE AVANCE
98715,12		129256,33	26,65%
BENEFICIARIOS			
MUJERES:	73 0	HOMBRES:	520
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			



OBJETO: MEJORAMIENTO VIAL DE VARIAS VÍAS DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR ETAPA 5

DATOS			
PROVINCIA:		CAÑAR	
CANTÓN:		AZOGUES, TRONCAL, DELEG, CAÑAR	
PARROQUIA:		VARIAS	
MONTO DEL CONTRATO:		3199942,72	
LONGITUD INTERVENIDA:		PLAZO (días):	390
RESULTADO OBTENIDOS			
PLANIFICADO		EJECUTADO	% DE AVANCE
266513,18		270000	8,44%
BENEFICIARIOS			
MUJERES:	4320	HOMBRES:	3310
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			



OBJETO: INTERVENCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE BASE Y RENOVACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN LAS CALLES JUAN MONTALVO Y ELOY ALFARO

DATOS			
PROVINCIA:		CAÑAR	
CANTÓN:		AZOGUES	
PARROQUIA:		AZOGUES	
MONTO DEL CONTRATO:		157.566,53	
LONGITUD INTERVENIDA: 370 M		PLAZO (días):	90
RESULTADO OBTENIDOS			
PLANIFICADO		EJECUTADO	% DE AVANCE
			0,00%
BENEFICIARIOS			
MUJERES:	8	HOMBRES:	65

REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBJETO: MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA VÍA SAN JOSÉ – DORA CANELOS – OCHOA LEÓN EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 0.84 KM, PARROQUIA SIDCAY, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY

DATOS			
PROVINCIA:		AZUAY	
CANTÓN:		CUENCA	
PARROQUIA:		SIDCAY	
MONTO DEL CONTRATO:		156547,03	
LONGITUD INTERVENIDA: 840 M		PLAZO (días):	120
RESULTADO OBTENIDOS			
PLANIFICADO		EJECUTADO	% DE AVANCE
29204,6		102105,87	65,22%
BENEFICIARIOS			
MUJERES:	42 3	HOMBRES:	260
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			



OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA VÍA SANTA ANA – SAN BARTOLOMÉ, EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 13.6 KM, UBICADA EN LA PARROQUIA DE SANTA ANA DEL CANTÓN CUENCA

DATOS			
PROVINCIA:		AZUAY	
CANTÓN:		CUENCA	
PARROQUIA:		SANTA ANA	
MONTO DEL CONTRATO:			
LONGITUD INTERVENIDA: 13.6 KM		PLAZO (días):	90
RESULTADO OBTENIDOS			
PLANIFICADO		EJECUTADO	% DE AVANCE
		0	
BENEFICIARIOS			
MUJERES:	250	HOMBRES:	2350
0			
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			



OBJETO: MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA VÍA TOMBAMBA – GUARAINAG, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS ABSCISAS 10+700 A 12+430, UBICADO EN LA PARROQUIA TOMBAMBA, CANTON PAUTE, PROVINCIA DEL AZUAY

DATOS			
PROVINCIA:		AZUAY	
CANTÓN:		PAUTE	
PARROQUIA:		TOMBAMBA	
MONTO DEL CONTRATO:		294004,16	
LONGITUD INTERVENIDA: 750 M		PLAZO (días):	120
RESULTADO OBTENIDOS			
PLANIFICADO		EJECUTADO	% DE AVANCE
777612,12		238688,24	81,19%
BENEFICIARIOS			
MUJERES:	156	HOMBRES:	93
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			



OBJETO: “MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA VÍA GRUTA DE LA VICTORIA BAJA - VICTORIA CENTRO - Y DESANTA MARTHA EN UNA LONGITUD DE 2.4 KM, PARROQUIA EL VALLE, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY”.

DATOS			
PROVINCIA:		AZUAY	
CANTÓN:		CUENCA	
PARROQUIA:		VALLE	
MONTO DEL CONTRATO:		\$283.528,89	
LONGITUD INTERVENIDA:	2.4 KM	PLAZO (días):	120 DÍAS
RESULTADO OBTENIDOS			
PLANIFICADO		EJECUTADO	% DE AVANCE
BENEFICIARIOS			
MUJERES:	1200	HOMBRES:	1200
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			



OBJETO: “MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DEL TRAMO VIAL: VÍA DE ACCESO A MINA DE LLATCÓN, EN UNA LONGITUD DE 1.9 KM”

DATOS			
PROVINCIA:		AZUAY	
CANTÓN:		Cuenca	
PARROQUIA:		Nulti	
MONTO DEL CONTRATO:		USD \$ 207.373,12	
LONGITUD INTERVENIDA:	1,9 KM	PLAZO (días):	60
RESULTADO OBTENIDOS			
PLANIFICADO		EJECUTADO	% DE AVANCE
		\$ 208.631,40	100%
BENEFICIARIOS			
MUJERES:	2217	HOMBRES:	2107
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			



OBJETO: "INTERVENCIÓN VIAL EN LAS CALLES CENTRALES DEL CANTÓN NABÓN, PROVINCIAL DEL AZUAY"

DATOS			
PROVINCIA:		AZUAY	
CANTÓN:		Nabón	
PARROQUIA:		Nabón	
MONTO DEL CONTRATO:		USD \$ 99.871,38	
LONGITUD INTERVENIDA:	1 km	PLAZO (días):	60 DÍAS
RESULTADO OBTENIDOS			
PLANIFICADO	EJECUTADO	% DE AVANCE	
	\$ 82.267,06	82,37%	
BENEFICIARIOS			
MUJERES:	726	HOMBRES:	550

REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBJETO: MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE LAS VÍAS: ANTONIO FLOR TRAMO 1, ANTONIO FLOR TRAMO 2, ARTURO SANDEZ, AV. CUENCA, JORGE ARAUJO Y JULIO CALLE; CANTÓN GIRÓN, PROVINCIA DE AZUAY.

DATOS			
PROVINCIA:		AZUAY	
CANTÓN:		GIRÓN	
PARROQUIA:		GIRON	
MONTO DEL CONTRATO:		\$ 397.266,22	
LONGITUD INTERVENIDA:	2,18km	PLAZO (días):	60
RESULTADO OBTENIDOS			
PLANIFICADO		EJECUTADO	% DE AVANCE
BENEFICIARIOS			
MUJERES:	6650	HOMBRES:	5532
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			



OBJETO: MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA VÍA CAÑARIBAMBA-SHAGLLI, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS ABSCISAS 20+000 A 21+000, UBICADO EN LA PARROQUIA SHAGLLI, CANTÓN SANTA ISABEL, DE LA PROVINCIA DEL AZUAY

DATOS			
PROVINCIA:		AZUAY	
CANTÓN:		Santa Isabel	
PARROQUIA:		Shagli	
MONTO DEL CONTRATO:		\$ 213.556,03	
LONGITUD INTERVENIDA: 1KM		PLAZO (días):	60
RESULTADO OBTENIDOS			
PLANIFICADO		EJECUTADO	% DE AVANCE
		\$ 126.555,40	59,26%
BENEFICIARIOS			
MUJERES:	1196	HOMBRES:	1038
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			



OBJETO: “CONTRATACIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL PARQUE CENTRAL DE LA PARROQUIA REMIGIO CRESPO TORAL”.

DATOS			
PROVINCIA:		AZUAY	
CANTÓN:		CUENCA	
PARROQUIA:		SAYAUSI	
MONTO DEL CONTRATO:		\$65.619,5016	
LONGITUD INTERVENIDA:	1.2 KM	PLAZO (días):	100
RESULTADO OBTENIDOS			
PLANIFICADO		EJECUTADO	% DE AVANCE
		\$ 4.410,16	6,72%
BENEFICIARIOS			
MUJERES:	540	HOMBRES:	600
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
			



4.3. GESTIÓN DE COMERCIALIZACIÓN


4.3.1. OBJETIVO GENERAL

Analizar los contratos gestionados con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), Gobierno Provinciales, y otras entidades, los logros alcanzados, los desafíos enfrentados y las recomendaciones para mejorar la gestión comercial futura.

4.3.2. RESULTADOS ALCANZADOS

Durante el período de enero a diciembre de 2025, se han adjudicado 42 contratos. Las principales entidades contratantes se resumen a continuación:

ENTIDAD	GRUPO	MONTO CONTRACTUAL	% POR ENTIDAD	% POR GRUPO
GAD PROVINCIAL DEL AZUAY	GAD PROVINCIAL DEL AZUAY	\$5,249,525.28	40.78%	40.78%
GAD PROVINCIAL DEL CAÑAR	GAD PROVINCIAL DEL CAÑAR	\$3,199,942.72	24.86%	24.86%
GAD MUNICIPAL DE AZOGUES	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES	\$1,431,035.60	11.12%	11.12%
GAD MUNICIPAL LOJA	GAD MUNICIPAL LOJA	\$1,113,086.71	8.65%	8.65%
GAD TURI	GADs PARROQUIAL DEL AZUAY	\$541,592.68	4.21%	11.60%
GAD DE BAÑOS	GADs PARROQUIAL DEL AZUAY	\$540,323.20	4.20%	
GAD DE RICAURTE	GADs PARROQUIAL DEL AZUAY	\$208,393.31	1.62%	
GAD SAYAUSÍ	GADs PARROQUIAL DEL AZUAY	\$104,992.74	0.82%	
GAD REMIGIO CRESPO	GADs PARROQUIAL DEL AZUAY	\$65,619.50	0.51%	
GAD DE GUACHAPALA	GADs PARROQUIAL DEL AZUAY	\$32,267.35	0.25%	
GAD DE PAUTE	GADs MUNICIPALES DEL AZUAY	\$19,999.56	0.16%	
GAD SANTA ISABEL	GADs MUNICIPALES DEL AZUAY	\$16,064.52	0.12%	
GAD DE GUALACEO	GADs MUNICIPALES DEL AZUAY	\$349,962.45	2.72%	
TOTAL		\$12,872,805.62	100.00%	100.00%

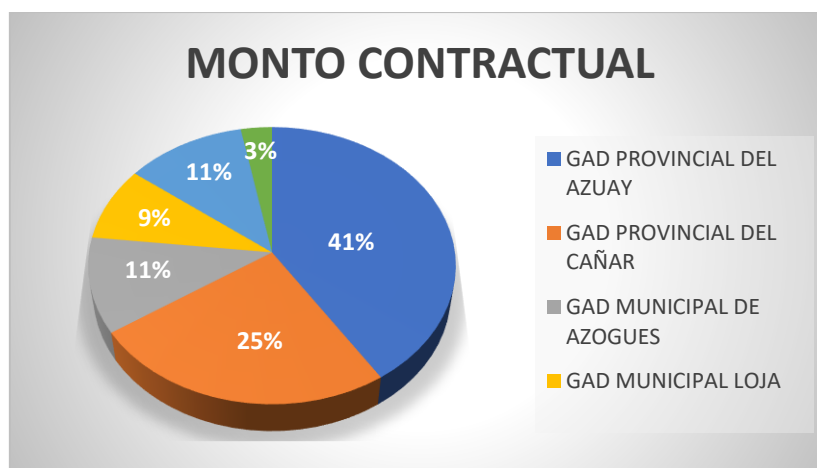

La principal entidad contratante fue el Gobierno Provincial del Azuay, sin embargo, también se gestionaron contratos con otros organismos.

Durante el ejercicio económico 2025, la empresa consolidó alianzas estratégicas con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) municipales y parroquiales lo que permitió ampliar significativamente la cobertura de servicios a nivel regional.

Estas estrategias personalizadas de relacionamiento institucional, sumada a visitas técnicas periódicas, fueron determinantes para fortalecer la confianza con los actores locales y consolidar una presencia sólida en el territorio.


Los contratos adjudicados fueron ejecutados en cumplimiento estricto con los estándares técnicos y administrativos exigidos por los entes contratantes.

A lo largo del año se registraron avances relevantes tanto en la adjudicación como en la ejecución de obras, posicionando a la empresa como un socio estratégico en la construcción y mejoramiento de infraestructura pública.

No obstante, el análisis operativo identificó oportunidades de mejora en los procesos de gestión comercial y coordinación interinstitucional, que deberán ser abordadas con acciones específicas en el corto plazo para optimizar el desempeño general.

4.3.3. PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

A continuación, se resume las actividades realizadas en el área Técnica referente a los de procesos durante el año 2025, los cuales fueron llevados a cabo conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su reglamento, y las resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP).

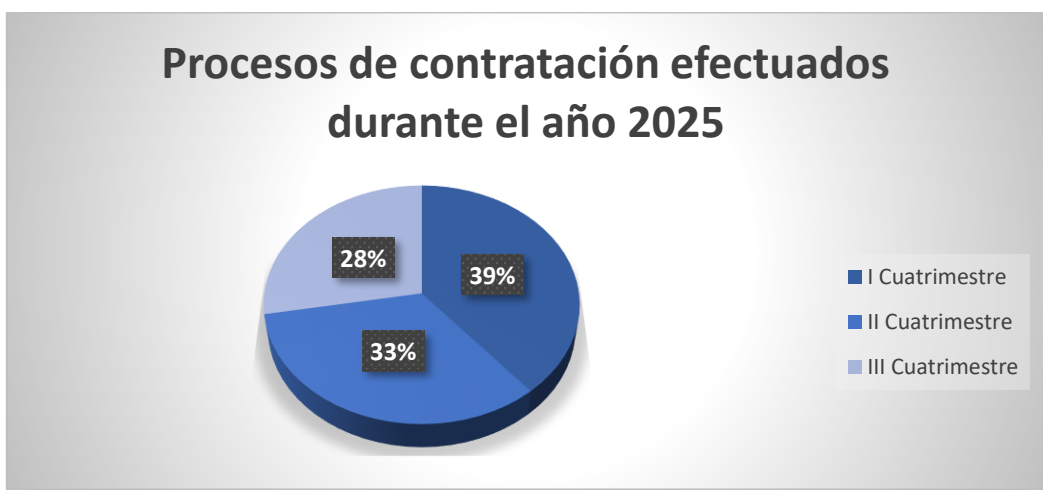

NRO	CÓDIGO	OBJETO DEL PROCESO	ESTADO DEL PROCESO	PRESUPUESTO REFERENCIAL (SIN IVA)	FECHA DE PUBLICACIÓN	CUATRIMESTRE
1	MCO-AEP-2025-008	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL, BORDILLOS Y CUNETAS EN LA VIA DEL BARRIO MOLINOPAMBA BAJO (SECTOR LAS BOTELLAS) DE LA PARROQUIA RICAURTE, CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY	Ejecución de Contrato	\$46,591.00	19/5/2025 15:00	II Cuatrimestre
2	MCO-AEP-2025-011	CONSTRUCCION DE BORDILLOS DE HORMIGÓN SIMPLE EN LA VÍA CHINGUILANCHI-AMABLE MARÍA DEL CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA	Ejecución de Contrato	\$223,830.00	20/5/2025 20:00	II Cuatrimestre
3	MCO-AEP-2025-012	CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS DE ALUMBRADO Y OBRAS CIVILES PARA EL PARQUE LA CUADRA	Ejecución de Contrato	\$133,088.99	28/5/2025 17:00	II Cuatrimestre
4	PE-AEP-2025-019	ADQUISICIÓN DE PIEDRA DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CIVIL	Finalizada	\$68,792.06	13/5/2025 15:00	II Cuatrimestre
5	PE-AEP-2025-020	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA VARIOS PROYECTOS QUE EJECUTA ASFALTAR EP CARGADORA FRONTAL PARA LAS PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE ASFALTAR EP	Desierta	\$30,821.00	29/5/2025 15:00	II Cuatrimestre
6	PE-AEP-2025-021	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA VARIOS PROYECTOS QUE EJECUTA ASFALTAR EP MANTENIMIENTO VIAL Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE AZOGUES	Finalizada	\$10,815.00	28/5/2025 14:00	II Cuatrimestre
7	PE-AEP-2025-023	ADQUISICIÓN DE AGREGADOS PETREOS FRENTE AZOGUES	Adjudicada	\$186,675.00	29/5/2025 10:00	II Cuatrimestre

NRO	CÓDIGO	OBJETO DEL PROCESO	ESTADO DEL PROCESO	PRESUPUESTO REFERENCIAL (SIN IVA)	FECHA DE PUBLICACIÓN	CUATRIMESTRE
8	PE-AEP-2025-024	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PVC PARA REDES DE ALCANTARILLADO FRENTE RICAURTE	Finalizada	\$2,118.47	5/6/2025 15:10	II Cuatrimestre
9	PE-AEP-2025-025	ADQUISICIÓN DE AGREGADOS PÉTREOS MEJORAMIENTO DE LA VIA CUMBE-SAN JOSE DE RARANGA, TRAMO: FLORESTA-Y QUINGEO	Adjudicada	\$22,902.28	6/6/2025 10:00	II Cuatrimestre
10	PE-AEP-2025-026	ADQUISICION DE HORMIGÓN PREMEZCLADO PARA LAS OBRAS DE HORMIGONES	Adjudicada	\$73,291.10	6/6/2025 15:00	II Cuatrimestre
11	PE-AEP-2025-027	ADQUISICIÓN DE ALCANTARILLAS DE PLACAS CORRUGADAS DE ACERO GALVANIZADO PARA LAS OBRAS DE DRENAJE VIAL VARIOS FRENTES	Finalizada	\$4,416.00	6/6/2025 9:45	II Cuatrimestre
12	PE-AEP-2025-028	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA VARIOS PROYECTOS QUE EJECUTA ASFALTAR EP FRENTE RICAURTE	Finalizada	\$13,295.00	12/6/2025 15:00	II Cuatrimestre
13	PE-AEP-2025-029	SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETES BAJO LA MODALIDAD M3- KM Y/O M3 PARA VARIOS PROYECTOS QUE SE ENCUENTRA EJECUTANDO LA EMPRESA ASFALTAR EP ETAPA 2	Desierta	\$207,460.00	18/6/2025 12:00	II Cuatrimestre
14	PE-AEP-2025-030	SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETES BAJO LA MODALIDAD M3- KM Y/O M3 PARA VARIOS PROYECTOS QUE SE ENCUENTRA EJECUTANDO LA EMPRESA ASFALTAR EP ETAPA 2	Desierta	\$207,460.00	26/6/2025 14:00	II Cuatrimestre
15	PE-AEP-2025-031	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA VARIOS PROYECTOS QUE EJECUTA ASFALTAR EP CARGADORA FRONTAL PARA LAS PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE ASFALTAR EP	Desierta	\$29,600.00	27/6/2025 15:00	II Cuatrimestre

NRO	CÓDIGO	OBJETO DEL PROCESO	ESTADO DEL PROCESO	PRESUPUESTO REFERENCIAL (SIN IVA)	FECHA DE PUBLICACIÓN	CUATRIMESTRE
16	PE-AEP-2025-21	ADQUISICIÓN DE AGREGADOS PETREOS FRENTE RICAURTE	Finalizada	\$30,200.62	27/5/2025 10:00	II Cuatrimestre
17	MCO-AEP-2025-007	CONSTRUCCION DE CABEZALES DE HORMIGON Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN EN LA VIA GRUTA DE LA VICTORIA BAJA - VICTORIA CENTRO - Y DE SANTA MARTHA EN UNA LONGITUD DE 2.4 KM, PARROQUIA EL VALLE, CANTON CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY	Ejecución de Contrato	\$50,489.20	20/3/2025 19:00	I Cuatrimestre
18	MCO-AEP-2025-009	CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y CUNETAS MURO DEHORMIGON CICLOPEO Y SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA VIA TOMBAMBA GUARAINAG TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS ABSCISAS 10mas700 A 12mas430 UBICADA EN LA PARROQUIA TOMBAMBACANTON PAUTE PROVINCIA DEL AZUAY	Ejecución de Contrato	\$40,989.24	7/4/2025 17:30	I Cuatrimestre
19	MCO-AEP-2025-010	CONSTRUCCION DE CABEZALES DE HORMIGON BORDILLOS Y CUNETAS EN LA VIA ANTIGUA CUENCA GIRON PASAJE EN UNA LONGITUD DE 7,00 KM EN LA PARROQUIA VICTORIA DEL PORTETE CANTON CUENCA PROVINCIA DEL AZUAY ETAPA I	Ejecución de Contrato	\$140,370.96	14/4/2025 17:30	I Cuatrimestre
20	PE-AEP-2025-008	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA VARIOS PROYECTOS QUE EJECUTA ASFALTAR EP FRENTE VÍA CHINGUILANCHI-AMABLE MARÍA	Finalizada	\$93,819.50	24/3/2025 14:20	I Cuatrimestre

NRO	CÓDIGO	OBJETO DEL PROCESO	ESTADO DEL PROCESO	PRESUPUESTO REFERENCIAL (SIN IVA)	FECHA DE PUBLICACIÓN	CUATRIMESTRE
21	PE-AEP-2025-009	ADQUISICIÓN DE GEOTEXTIL PARA OBRAS DE DRENAJE EN LAS VIAS Y ADQUISICIÓN DE GEOMEMBRANA PARA OBRAS VIALES	Adjudicada	\$27,265.04	4/4/2025 14:00	I Cuatrimestre
22	PE-AEP-2025-010	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA VARIOS PROYECTOS QUE EJECUTA ASFALTAR EP- SISTEMA PROVINCIAL DE PEAJES	Finalizada	\$19,776.00	10/4/2025 14:30	I Cuatrimestre
23	PE-AEP-2025-012	ADQUISICIÓN DE AGREGADOS PÉTREOS - MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA EL FRENTE CHINGUILANCHI-AMABLE MARÍA DEL CANTÓN LOJA	Adjudicada	\$35,100.00	15/4/2025 14:00	I Cuatrimestre
24	PE-AEP-2025-014	ADQUISICIÓN DE AGREGADOS PÉTREOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE LA CUADRA	Finalizada	\$18,508.70	30/4/2025 14:00	I Cuatrimestre
25	PE-AEP-2025-016	ADQUISICIÓN DE ALCANTARILLAS DE PLACAS CORRUGADAS DE ACERO GALVANIZADO PARA LAS OBRAS DE DRENAJE VIAL FRENTE CHINGUILANCHI-AMABLE MARÍA DEL CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA	Adjudicada	\$21,381.00	25/4/2025 14:00	I Cuatrimestre
26	PE-AEP-2025-018	ADQUISICIÓN DE AGREGADOS PÉTREOS ZONA 2	Adjudicada	\$73,153.72	9/5/2025 15:00	II Cuatrimestre
27	PE-AEP-2025-13	ADQUISICION DE PIEDRA PARA LAS OBRAS VIALES FRENTE CHINGUILANCHI-AMABLE MARÍA DEL CANTÓN LOJA	Desierta	\$40,697.60	23/4/2025 16:00	I Cuatrimestre
28	PE-AEP-2025-15	ADQUISICIÓN DE ALCANTARILLAS DE PLACAS CORRUGADAS DE ACERO GALVANIZADO PARA LAS OBRAS DE DRENAJE VIAL FRENTE CHINGUILANCHI-AMABLE MARÍA DEL CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA"	Desierta	\$21,381.00	23/4/2025 12:00	I Cuatrimestre

NRO	CÓDIGO	OBJETO DEL PROCESO	ESTADO DEL PROCESO	PRESUPUESTO REFERENCIAL (SIN IVA)	FECHA DE PUBLICACIÓN	CUATRIMESTRE
29	PE-AEP-2025-17	ADQUISICION DE PIEDRA PARA LAS OBRAS VIALES FRENTE CHINGUILANCHI-AMABLE MARÍA DEL CANTÓN LOJA	Desierta	\$40,697.60	25/4/2025 14:30	I Cuatrimestre
30	CDC-AEP-2025-001	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EJECUTAR ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA SUELOS HORMIGONES Y ASFALTOS	Ejecución de Contrato	\$49,207.96	19/2/2025 18:00	I Cuatrimestre
31	COTO-AEP-2025-001	CONSTRUCCION DE MUROS DE ESCOLLERA, MUROS DE HORMIGÓN ARMADO (CABEZALES), SUMIDEROS, POZOS DE REVISIÓN Y BORDILLOS EN LA VÍA CHINGUILANCHI - AMABLE MARÍA DEL CANTON LOJA. PROVINCIA DE LOJA	Desierta	\$269,457.70	5/3/2025 17:30	I Cuatrimestre
32	MCO-AEP-2025-001	CONSTRUCCION DE CABEZALES DE HORMIGON CUNETAS Y BORDILLOS DEL TRAMO VIAL PUENTE VIOLA Y DE SAN JOSE DE RARANGA ENTRE LAS ABSCISAS 2mas400 A LA 3mas300	Ejecución de Contrato	\$51,714.47	10/2/2025 17:30	I Cuatrimestre
33	MCO-AEP-2025-002	CONSTRUCCION DE CABEZALES DE HORMIGON CUNETAS Y BORDILLOS DE LA VIA CANARIBAMBA SHAGLLI TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS ABSCISAS 20mas000 A 21mas000 UBICADO EN LA PARROQUIA SHAGLLI, CANTÓN SANTA ISABEL, DE LA PROVINCIA DEL AZUAY	Adjudicado - Registro de Contratos	\$52,771.97	11/2/2025 17:30	I Cuatrimestre
34	MCO-AEP-2025-004	CONSTRUCCION DE OBRAS HIDROSANITARIAS, DRENES, BORDILLOS Y CUNETAS EN LA VIA PICOTACUCHO BUENOS AIRES UBICADA DENTRO DE LA PARROQUIA DE SAYAUSI	Ejecución de Contrato	\$114,366.81	19/2/2025 16:00	I Cuatrimestre

NRO	CÓDIGO	OBJETO DEL PROCESO	ESTADO DEL PROCESO	PRESUPUESTO REFERENCIAL (SIN IVA)	FECHA DE PUBLICACIÓN	CUATRIMESTRE
35	MCO-AEP-2025-005	CONSTRUCCION DE CABEZALES DE HORMIGON CUNETAS Y BORDILLOS EN LA VIA CUMBE SAN JOSE DE RARANGA TRAMO FLORESTA Y QUINGEO EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 2,8 KM UBICADO EN LA PARROQUIA CUMBE DEL CANTON CUENCA DE LA PROVINCIA DEL AZUAY	Adjudicado - Registro de Contratos	\$134,216.97	20/2/2025 16:00	I Cuatrimestre
36	MCO-AEP-2025-006	CONSTRUCCION DE CUNETAS Y BORDILLOS EN LA VIA SAN JOSE DORA CANELOS OCHOA LEON EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 0,84 KM PARROQUIA SIDCAY CANTON CUENCA PROVINCIA DEL AZUAY.	Ejecución de Contrato	\$35,915.92	7/3/2025 17:30	I Cuatrimestre
37	MCO-AEP-2025-03	CONSTRUCCION DE BORDILLOS CUNETAS BACHEO ASFALTICO DEL TRAMO VIAL VIA DE ACCESO A MINA DE LLATCON EN UNA LONGITUD DE 1,9 KM	Ejecución de Contrato	\$49,194.13	13/2/2025 17:30	I Cuatrimestre
38	PE-AEP-2025-001	SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETES BAJO LA MODALIDAD M3-KM Y/O M3 PARA VARIOS PROYECTOS QUE SE ENCUENTRA EJECUTANDO LA EMPRESA ASFALTAR EP	Finalizada	\$272,651.00	20/2/2025 14:30	I Cuatrimestre
39	PE-AEP-2025-002	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES	Finalizada	\$13,460.00	6/3/2025 14:30	I Cuatrimestre
40	PE-AEP-2025-003	ADQUISICIÓN DE AGREGADOS PÉTREOS ZONA 1	Finalizada	\$144,845.82	27/2/2025 14:00	I Cuatrimestre
41	PE-AEP-2025-004	ADQUISICIÓN DE GEOTEXTIL PARA OBRAS DE DRENAJE EN LAS VIAS Y ADQUISICIÓN DE GEOMEMBRANA PARA OBRAS VIALES	Desierta	\$30,158.00	11/3/2025 8:00	I Cuatrimestre

NRO	CÓDIGO	OBJETO DEL PROCESO	ESTADO DEL PROCESO	PRESUPUESTO REFERENCIAL (SIN IVA)	FECHA DE PUBLICACIÓN	CUATRIMESTRE
42	PE-AEP-2025-005	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PVC PERFORADA DE DRENAJE PARA LOS PROYECTOS VIALES, ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PVC PARA REDES DE AGUA POTABLE Y ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PVC PARA REDES DE ALCANTARILLADO	Finalizada	\$27,480.22	6/3/2025 15:00	I Cuatrimestre
43	PE-AEP-2025-006	ADQUISICION DE ADITIVO QUIMICO PARA ADITIVAR AL ASFALTO AC-20 EN LA PLANTA DE PRODUCCION	Adjudicada	\$51,465.60	28/2/2025 10:00	I Cuatrimestre
44	PE-AEP-2025-007	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES	Adjudicada	\$40,896.00	19/3/2025 15:00	I Cuatrimestre
45	PE-AEP-2025-2441	ADQUISICION DE ADITIVO QUIMICO PARA ADITIVAR AL ASFALTO AC-20 EN LA PLANTA DE PRODUCCION	Desierta	\$51,480.00	14/1/2025 11:00	I Cuatrimestre
46	PE-AEP-2025-2442	ADQUISICION Y TRANSPORTE DE CEMENTO ASFALTICO AC20 DESIGNADO PARA LA ELABORACION DE MEZCLA ASFALTICA	Finalizada	\$369,494.00	13/1/2025 17:00	I Cuatrimestre
47	PE-AEP-2025-2443	ADQUSICIÓN DE VARILLAS DE ACERO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA EMPRESA ASFALTAR EP	Finalizada	\$20,317.70	13/1/2025 16:00	I Cuatrimestre
48	PE-AEP-2025-2444	ADQUISICION DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL PARA VARIOS PROYECTOS QUE EJECUTA LA EMPRESA ASFALTAR EP	Adjudicada	\$110,675.05	16/1/2025 14:00	I Cuatrimestre
49	PE-AEP-2025-2439	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA VARIOS PROYECTOS QUE EJECUTA ASFALTAR EP PROYECTO CON EL GAD DE DUG DUG	Finalizada	\$48,225.60	7/1/2025 13:00	I Cuatrimestre
50	PE-AEP-2025-2440	COMPRA DE ARIDOS TRITURADOS	Adjudicada	\$378,500.00	7/1/2025 14:00	I Cuatrimestre

NRO	CÓDIGO	OBJETO DEL PROCESO	ESTADO DEL PROCESO	PRESUPUESTO REFERENCIAL (SIN IVA)	FECHA DE PUBLICACIÓN	CUATRIMESTRE
51	LICO-AEP-2025-001	CONSTRUCCION DE OBRAS HIDROSANITARIAS, OBRAS DE DRENAJE, MUROS, VEREDAS, BORDILLOS Y CUNETAS EN VARIAS VÍAS DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR ETAPA 5	Ejecución de Contrato	\$783,874.14	28/10/2025 19:00	III Cuatrimestre
52	PE-AEP-2025-043	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA VARIOS PROYECTOS QUE EJECUTA ASFALTAR EP FRENTE CAÑAR	Desierta	\$73,325.04	1/10/2025 14:30	III Cuatrimestre
53	PE-AEP-2025-044	ADQUISICION DE AGREGADOS PETREOS FRENTE CAÑAR ZONA 2	Adjudicada	\$47,163.00	17/10/2025 8:45	III Cuatrimestre
54	PE-AEP-2025-045	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA VARIOS PROYECTOS QUE EJECUTA ASFALTAR EP FRENTE VI A CHINGUILANCHI-AMABLE MARI A ETAPA 2	Desierta	\$22,895.00	17/10/2025 9:00	III Cuatrimestre
55	PE-AEP-2025-046	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA VARIOS PROYECTOS QUE EJECUTA ASFALTAR EP FRENTE CANAR	Adjudicada	\$73,260.00	21/10/2025 14:40	III Cuatrimestre
56	PE-AEP-2025-047	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA VARIOS PROYECTOS QUE EJECUTA ASFALTAR EP CARGADORA FRONTAL PARA LAS PLANTAS DE PRODUCCION DE ASFALTAR EP	Desierta	\$33,300.00	21/10/2025 11:00	III Cuatrimestre
57	PE-AEP-2025-048	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA EMPRESA ASFALTAR EP EN LA CIUDAD DE CUENCA ETAPA 2	Desierta	\$94,076.85	30/10/2025 14:06	III Cuatrimestre

NRO	CÓDIGO	OBJETO DEL PROCESO	ESTADO DEL PROCESO	PRESUPUESTO REFERENCIAL (SIN IVA)	FECHA DE PUBLICACIÓN	CUATRIMESTRE
58	PE-AEP-2025-049	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA VARIOS PROYECTOS QUE EJECUTA ASFALTAR EP FRENTE VÍA CHINGUILANCHI-AMABLE MARÍA ETAPA 2	Adjudicada	\$22,895.00	30/10/2025 12:20	III Cuatrimestre
59	PE-AEP-2025-051	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA VARIOS PROYECTOS QUE EJECUTA ASFALTAR EP CARGADORA FRONTAL PARA LAS PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE ASFALTAR EP	Adjudicada	\$33,300.00	10/11/2025 15:00	III Cuatrimestre
60	PE-AEP-2025-052	ADQUISICION DE AGREGADOS PETREOS FRENTE CAN AR ZONA 1	Adjudicada	\$180,724.50	19/11/2025 15:00	III Cuatrimestre
61	PE-AEP-2025-053	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA VARIOS PROYECTOS QUE EJECUTA ASFALTAR EP SISTEMA PROVINCIAL DE PEAJES FRENTE GIRO N – SAN FERNANDO	Desierta	\$13,232.00	19/11/2025 9:00	III Cuatrimestre
62	PE-AEP-2025-054	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA VARIOS PROYECTOS QUE EJECUTA ASFALTAR EP SISTEMA PROVINCIAL DE PEAJES FRENTE ZHUCAY – TUTUPALI Y TURI-TARQUI	Desierta	\$8,632.00	19/11/2025 10:00	III Cuatrimestre
63	PE-AEP-2025-055	ADQUISICION DE AGREGADOS PETREOS FRENTE SAYAUSI Y FRENTE UTE	Adjudicada	\$31,568.20	28/11/2025 15:00	III Cuatrimestre
64	PE-AEP-2025-056	ADQUISICION DE AGREGADOS PETREOS FRENTE OC	Adjudicada	\$63,478.93	19/11/2025 15:30	III Cuatrimestre


NRO	CÓDIGO	OBJETO DEL PROCESO	ESTADO DEL PROCESO	PRESUPUESTO REFERENCIAL (SIN IVA)	FECHA DE PUBLICACIÓN	CUATRIMESTRE
65	PE-AEP-2025-057	ADQUISICIÓN DE TUBERIAS DE PVC PARA AGUA PÓTABLE Y ADQUISICIÓN DE TUBERIAS DE PVC PARA ALCANTARILLADO VARIOS FRENTE?	Adjudicada	\$18,074.94	24/11/2025 10:00	III Cuatrimestre
66	PE-AEP-2025-058	ADQUISICION DE HORMIGON PREMEZCLADO PARA LAS OBRAS DE HORMIGONES FRENTE 5 ESQUINAS CORAZON DE JESUS	Adjudicada	\$9,938.68	16/12/2025 13:00	III Cuatrimestre
67	PE-AEP-2025-059	ADQUISICION Y TRANSPORTE DE CEMENTO ASFALTICO AC20 PARA VARIOS PROYECTOS DE ASFALTAR EP	Adjudicada	\$628,543.50	15/12/2025 14:00	III Cuatrimestre
68	PE-AEP-2025-061	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA VARIOS PROYECTOS QUE EJECUTA ASFALTAR EP FRENTE AZOGUES, LLATCON	Desierta	\$34,450.00	31/12/2025 11:00	III Cuatrimestre
69	MCO-AEP-2025-013	CONSTRUCCION DE MUROS, VEREDAS Y BORDILLOS DE LAS VIAS: ANTONIO FLOR TRAMO 1, ANTONIO FLOR TRAMO 2, ARTURO SANDEZ Y JULIO CALLE; CANTON GIRON, PROVINCIA DE AZUAY	Ejecución de Contrato	\$85,756.00	23/7/2025 17:00	II Cuatrimestre
70	MCO-AEP-2025-014	CONSTRUCCION DE CABEZALES DE HORMIGON, BORDILLOS Y CUNETAS EN LA VIA CUTCHIL - LUDO TRAMO E594, COMUNIDAD DE SAN ANTONIO EN UNA LONGITUD DE 1,08 KM, UBICADO EN LA PARROQUIA CUTCHIL, CANTON SIGSIG, PROVINCIA DEL AZUAY	Desierta	\$50,630.26	24/7/2025 15:00	II Cuatrimestre
71	MCO-AEP-2025-016	CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y CUNETAS EN UN TRAMO DE LA VIA RUMIHURCO - BELLAVISTA, CON UNA LONGITUD DE 240 METROS, UBICADA EN EL CANTON PAUTE, PROVINCIA DEL AZUAY	Ejecución de Contrato	\$10,377.00	30/7/2025 18:00	II Cuatrimestre

NRO	CÓDIGO	OBJETO DEL PROCESO	ESTADO DEL PROCESO	PRESUPUESTO REFERENCIAL (SIN IVA)	FECHA DE PUBLICACIÓN	CUATRIMESTRE
72	MCO-AEP-2025-15	CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y CUNETAS EN UN TRAMO DE LA VIA RUMIHURCO - BELLAVISTA, CON UNA LONGITUD DE 240 METROS, UBICADA EN EL CANTON PAUTE, PROVINCIA DEL AZUAY	Desierta	\$10,377.00	18/7/2025 15:00	II Cuatrimestre
73	PE-AEP-2025-032	COMPRA DE ARIDOS TRITURADOS VARIOS FRENTES	Adjudicada	\$321,925.00	29/7/2025 14:00	II Cuatrimestre
74	PE-AEP-2025-034	SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETES BAJO LA MODALIDAD M3- KM Y/O M3 PARA VARIOS PROYECTOS QUE SE ENCUENTRA EJECUTANDO LA EMPRESA ASFALTAR EP ETAPA 3	Desierta	\$51,335.00	18/7/2025 9:00	II Cuatrimestre
75	PE-AEP-2025-035	?ADQUISICION DE PIEDRA PARA LAS OBRAS VIALES FRENTE CHINGUILANCHI-AMABLE MARÍA DEL CANTÓN LOJA?	Desierta	\$20,250.00	21/7/2025 14:00	II Cuatrimestre
76	PE-AEP-2025-036	?SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETES BAJO LA MODALIDAD M3- KM Y/O M3 PARA VARIOS PROYECTOS QUE SE ENCUENTRA EJECUTANDO LA EMPRESA ASFALTAR EP ETAPA 2?	Finalizada	\$194,616.00	28/7/2025 15:00	II Cuatrimestre
77	PE-AEP-2025-037	?SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETES BAJO LA MODALIDAD M3- KM Y/O M3 PARA VARIOS PROYECTOS QUE SE ENCUENTRA EJECUTANDO LA EMPRESA ASFALTAR EP ETAPA 3?	Finalizada	\$51,335.00	22/7/2025 16:00	II Cuatrimestre
78	PE-AEP-2025-038	ADQUISICION DE CEMENTO MH PARA ESTABILIZACION DE SUELO CEMENTO	Adjudicada	\$156,922.60	18/8/2025 15:00	II Cuatrimestre

NRO	CÓDIGO	OBJETO DEL PROCESO	ESTADO DEL PROCESO	PRESUPUESTO REFERENCIAL (SIN IVA)	FECHA DE PUBLICACIÓN	CUATRIMESTRE
79	PE-AEP-2025-039	ADQUISICIÓN DE TUBOS ESTRUCTURALES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA O EDIFICACIONES Y ADQUISICIÓN DE VARILLAS DE ACERO	Finalizada	\$17,368.20	22/7/2025 19:00	II Cuatrimestre
80	PE-AEP-2025-040	ADQUISICIÓN DE ARENA PARA LA PRODUCCIÓN DE HÓRMIGONES	Adjudicada	\$63,550.00	2/9/2025 15:00	III Cuatrimestre
81	PE-AEP-2025-041	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA VARIOS PROYECTOS QUE EJECUTA ASFALTAR EN FRENTE OCTAVIO CORDERO Y FRENTE 5 ESQUINAS – CORAZÓN DE JESUS	Adjudicada	\$20,170.00	11/9/2025 15:00	III Cuatrimestre
82	PE-AEP-2025-042	SERVICIO DE FABRICACIÓN, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO RECREATIVO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LA CUADRA	Desierta	\$62,647.11	26/9/2025 15:00	III Cuatrimestre
83	PE-AEP-2025-042.	ADQUISICION DE AGREGADOS PETREOS FRENTE OCTAVIO CORDERO Y FRENTE 5 ESQUINAS – CORAZÓN DE JESUS?	Desierta	\$62,647.11	26/9/2025 15:00	III Cuatrimestre
84	SIE-AEP-2025-009	SERVICIO DE FABRICACIÓN, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO RECREATIVO PARA EL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LA CUADRA	Ejecución de Contrato	\$43,180.60	23/9/2025 17:00	III Cuatrimestre
85	SIE-AEP-2025-010	ADQUISICIÓN DE VIDRIO LAMINADO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LA CUADRA E INCLUIDA INSTALACIÓN	Ejecución de Contrato	\$16,832.10	25/9/2025 15:00	III Cuatrimestre
86	SIE-AEP-2025-011	SERVICIO DE COLOCACION DE PIEDRA	Ejecución de Contrato	\$47,442.99	25/9/2025 16:00	III Cuatrimestre

NRO	CÓDIGO	OBJETO DEL PROCESO	ESTADO DEL PROCESO	PRESUPUESTO REFERENCIAL (SIN IVA)	FECHA DE PUBLICACIÓN	CUATRIMESTRE
87	COTB-AEP-2025-001	ADQUISICIÓN DE DIESEL PREMIUM INDUSTRIAL INCLUIDO TRANSPORTE PARA VARIOS PROYECTOS QUE EJECUTA ASFALTAR EP	Ejecución de Contrato	\$273,714.15	11/7/2025 14:00	II Cuatrimestre
88	PE-AEP-2025-033	ADQUISICION DE AGREGADOS PETREOS MATERIAL FILTRANTE CON GRAVA - FRENTE CHINGUILANCHI-AMABLE MARÍA DEL CANTÓN LOJA	Adjudicada	\$38,327.24	11/7/2025 14:00	II Cuatrimestre
89	RE-CEP-AEP-2025-002	ADQUISICIÓN DE PLANTAS, ABONOS E INSUMOS INCLUIDO EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y COLOCACIÓN EN LAS ÁREAS DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA ASFALTAR EP	Ejecución de Contrato	\$13,298.20	28/3/2025 17:00	I Cuatrimestre
90	RE-CEP-AEP-2025-001	ADQUISICIÓN DE PLANTAS, ABONOS E INSUMOS INCLUIDO EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y COLOCACIÓN EN LAS ÁREAS DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA ASFALTAR EP	Desierta	\$13,298.20	24/3/2025 15:00	I Cuatrimestre

Se presenta a continuación el estado de proceso dentro de cada cuatrimestre del año 2025:

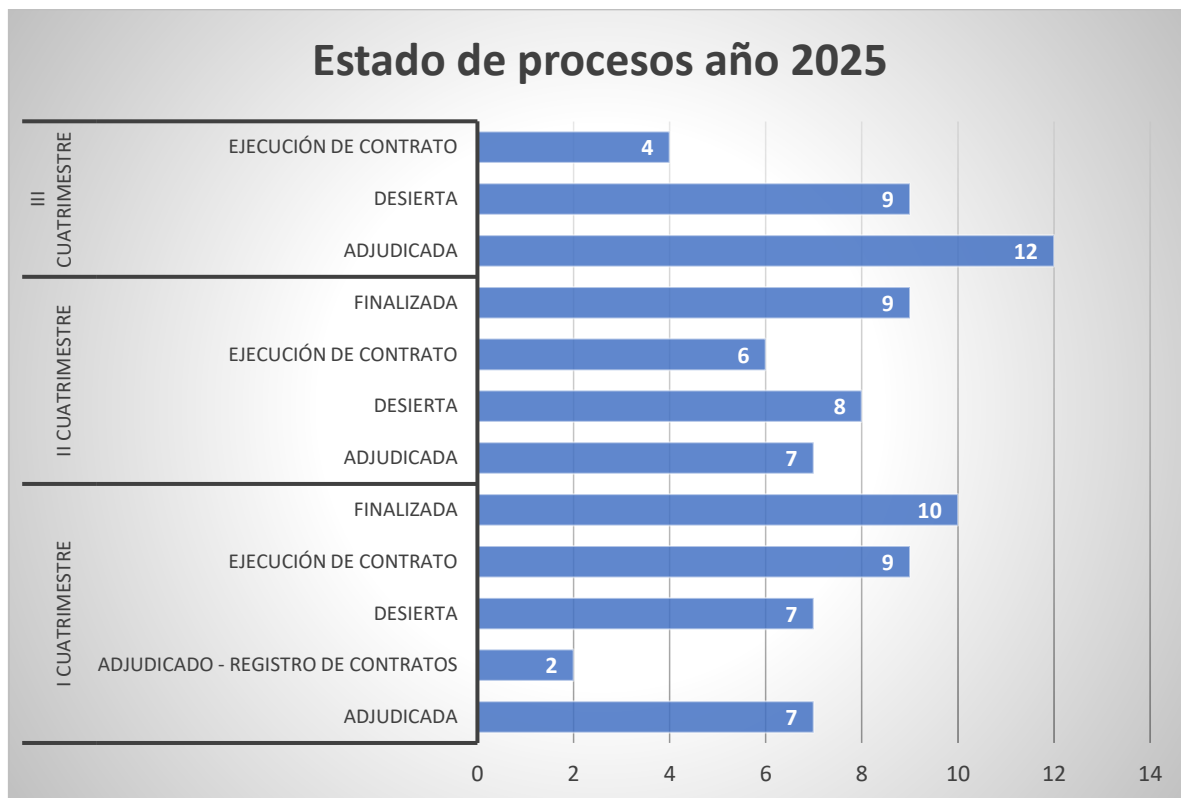

4.4. GESTIÓN DE PRODUCCIÓN

4.4.1. ACTIVIDADES REALIZADAS

La planta cuenta con dos procesos principales: el área de producción de mezcla asfáltica en caliente y el área de procesamiento de áridos y agregados para subestructura.

El presente informe recopila los trabajos ejecutados durante el año 2025, con corte al mes de diciembre de las actividades:

- Producción de Mezcla Asfáltica en Caliente
- Producción de Áridos
- Operador Minero del Libre Aprovechamiento de “La Virginia”

4.4.2. ACTIVIDADES REALIZADAS

ITEM	PRODUCTO	MTS3
1	Base clase 1	21,736.18
2	Mejoramiento	7,199.03
3	Piedra Escollera	11,178.47
4	Polvo 3/16	24.00
5	Triturado ¾	105.20
6	Pedraplen	20.00
7	Subbase	845.12
8	Agregado 3/8	801.44
9	Filtro	448.60
Total general		42,358.04

4.4.3. RESULTADOS ALCANZADOS

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de despachos de mezcla asfáltica realizados. En total se han despachado 12.299,50 m³ de mezcla asfáltica, de los cuales el 98.85% (12.158,00 m³) corresponden a contratos de la empresa ASFALTAR EP y el 1.15% (141.50 m³) a ventas contra factura.

OPERACIÓN	VOLUMEN. m3
PROYECTOS CONTRATADOS POR EL GPA	10.136,50
VENTA CONTRA FACTURA PRIVADO	141,50
PROYECTOS CONTRATADOS SECTOR PUBLICO	1.949,50
PROYECTOS CONTRATADOS ASFALTAR PRIVADO	72,00
TOTAL	12.299,50

Del mismo modo, a continuación, se detalla el cuadro resumen de despachos de productos pétreos.

OPERACIÓN	VOLUMEN. m3
PROYECTOS CONTRATADOS ASFALTAR PUBLICO	5.591,12
PROYECTOS CONTRATADOS POR EL GPA	36.669,42
TOTAL	42.260,54

4.4.4. PROYECTOS RELEVANTES EN EJECUCIÓN

Existen tres procesos de gran relevancia que se encuentran en proceso y marcarían un hito en la producción:

- **Traslado de la Planta de Mezcla Asfáltica en Caliente:** Actualmente se encuentra el terreno ya arrendado, a la espera de maquinaria para realizar la conformación de las plataformas y los permisos de funcionamiento en trámite. Este proyecto permitirá reducir costos de producción y transporte de mezcla asfáltica.
- **Adquisición de Grupo de Trituración móvil:** Este proyecto permitirá incrementar la capacidad de trituración, reducir costos de producción y reemplazar los equipos cuyo tiempo de vida útil se han completado.
- **Red de Trituración Provincial:** Este proyecto contempla la conformación de estaciones de trituración a nivel de provincia y abre el mercado para la comercialización de áridos y agregados pétreos.

4.4.5. CONCLUSIONES GESTIÓN TÉCNICA

Durante el año 2025, ASFALTAR EP desarrolló sus actividades en un entorno marcado por diversos factores externos e internos que condicionaron la planificación, programación y ejecución de los proyectos. Entre estos se destacan cambios normativos del SERCOP que generaron retrasos en los procesos de contratación pública, la afectación en el abastecimiento de materia prima derivada del incendio en la refinería, el incremento de precios del combustible, materiales e insumos estratégicos y el cierre de la mina La Virginia en el cantón Paute, que limitó temporalmente la disponibilidad de agregados pétreos.

No obstante, la empresa demostró una importante capacidad de respuesta y resiliencia, gracias a la adopción oportuna de medidas correctivas y ajustes estratégicos en la planificación, lo que permitió mantener la operatividad de varios proyectos y reprogramar recursos y tiempos de ejecución en otros.

Este resultado fue posible gracias al trabajo coordinado y comprometido de todas las áreas funcionales con el propósito de aprovechar de manera eficiente la capacidad instalada, optimizar los procesos de producción y reducir el desperdicio de materias primas y de la mezcla asfáltica.

Con respecto a la mano de obra, así como los equipos y la maquinaria, fueron estratégicamente direccionados hacia los frentes de trabajo activos o asignados a actividades prioritarias a nivel institucional que no se vieron directamente afectadas por los factores previamente mencionados.

En cuanto a la gestión de peajes, se ejecutaron actividades de mantenimiento periódico, tanto preventivo como correctivo, en las vías bajo este sistema, garantizando mejores condiciones de seguridad y transitabilidad para los usuarios.

De igual manera, se diversificaron las obras de infraestructura civil, incorporando la construcción y mejoramiento de parques y otros, lo que evidencia la capacidad técnica y operativa del personal de la empresa.

Paralelamente, se impulsó de manera sostenida la expansión territorial, concretando operaciones en otras provincias y fortaleciendo la presencia institucional.

En conjunto, las actividades desarrolladas fortalecieron la infraestructura vial de la provincia, contribuyendo de manera directa a mejorar la calidad de vida de la población y facilitando el acceso a productores y comerciantes en las zonas de intervenidas.

Desde una perspectiva técnica, los trabajos realizados permitieron optimizar la conectividad territorial, reducir los tiempos de traslado, disminuir los costos logísticos y mejorar las condiciones de seguridad vial, generando mayor eficiencia en la movilidad de bienes y personas.

El mejoramiento de la red vial favorece la dinamización de las economías locales, impulsando la productividad, el acceso a mercados y la integración de sectores rurales, lo que incide positivamente en la generación de empleo y en el fortalecimiento productivo en las zonas intervenidas.

Desde una visión institucional y de política pública, estos resultados consolidan el rol de la empresa como un actor estratégico en el desarrollo territorial y orientado a reducir brechas de desigualdad, promover la equidad y garantizar mejores oportunidades para todos los ciudadanos.

De esta manera, la gestión realizada no solo responde a criterios de eficiencia técnica, sino también a un firme compromiso con el desarrollo sostenible y el bienestar colectivo.

4.5. GESTIÓN DE PEAJES

4.5.1. OBJETIVO GENERAL

Velar por el adecuado estado de servicio de las vías que forman parte del sistema de peajes, mediante la ejecución permanente de actividades de mantenimiento vial, tanto preventivo como correctivo, que aseguren la funcionalidad y durabilidad de la infraestructura.

Garantizar el uso eficiente y eficaz de los equipos, materiales y recursos económicos, optimizando su asignación conforme a las necesidades operativas, con el propósito de asegurar condiciones adecuadas de transitabilidad que permitan una circulación segura, cómoda y fluida para los usuarios.

4.5.2. RESULTADOS ALCANZADOS

Gestión vial en:

DETALLE	PEAJE LA RAMADA NABÓN	PEAJE GIRÓN SAN FERNANDO	PEAJE ZHUCAT TUTUPALI	PEAJE TURI TARQUI	TOTAL KM
KM PEAJES	16,5	21	8,9	15,3	61,7

4.5.3. BENEFICIARIOS

PEAJE	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
La Ramada – Nabón	8.195	6.926	15.121
Girón – San Fernando	7.04	6.144	13.184
Zhucay – Tutupali	6.125	4.815	10.94
Turi- Tarqui	7.365	5.132	12.497
TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS			51.742

4.5.4. ACTIVIDADES REALIZADAS

En el sistema de peajes se intervinieron 620,56 km mediante actividades de mantenimiento rutinario de cunetas y drenajes. Para ello, se utilizaron 694 horas de alquiler de maquinaria para la atención de mantenimientos emergentes en toda la red.

Se ejecutaron trabajos de bacheo a nivel de base y conformación de veredas con material de mejoramiento, para lo cual se emplearon 286 horas de alquiler de equipo caminero.

Adicionalmente, se realizaron actividades de rotura de roca por un volumen de 30 m³, junto con otras intervenciones menores.

Estas acciones se ejecutaron en cumplimiento del objeto establecido en el convenio, contribuyendo al adecuado mantenimiento y operatividad de la infraestructura vial.

A continuación, se adjunta registro fotográfico con las principales actividades realizadas en el Sistema Provincial de Peajes.





4.5.5. AVANCE FINANCIERO

GRUPO	PEAJE	CODIFICA	DEVENGADO	%
13 - TASAS Y CONTRIBUCIONES	Total	\$672,789	\$641,719	95.38%
	PEAJE ZHUCAY-TUTUPALI	\$178,073	\$168,286	94.50%
	PEAJE TURI-TARQUI	\$176,048	\$165,106	93.78%
	PEAJE GIRON-SAN FERNANDO	\$204,193	\$197,233	96.59%
	PEAJE LA RAMADA-NABON	\$114,475	\$111,094	97.05%
18 - TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	Total	\$789,645	\$721,794	91.41%
	PEAJE TURI – TARQUI	\$182,396	\$162,071	88.86%
	PEAJE GIRON - SAN FERNANDO	\$184,549	\$178,706	96.83%
	PEAJE LA RAMADA - NABON	\$255,720	\$225,358	88.13%
	PEAJE ZHUCAY – TUTUPALI	\$166,980	\$155,659	93.22%

4.5.6. DIFICULTADES Y DESAFÍOS

Entre las principales dificultades identificadas se encuentran las presentes en la vía La Ramada - Nabón, la cual registra múltiples fallas geológicas activas, incluyendo macro deslizamientos, hundimientos y pérdida de calzada, lo que afecta de manera significativa la estabilidad y seguridad de la vía.

De igual manera, las vías que conforman el Sistema Provincial de Peajes han cumplido su vida útil, por lo que resulta necesario que el Gobierno Provincial del Azuay considere la ejecución de procesos de mejoramiento integral o rehabilitación estructural de las mismas.

Actualmente, el sistema está conformado por cuatro vías bajo un modelo de peaje subsidiado por el Gobierno Provincial del Azuay, lo que implica que los ingresos generados por recaudación no son suficientes para cubrir las necesidades de mantenimiento.

Esta limitación presupuestaria ha restringido la intervención a acciones emergentes y de carácter paliativo, dificultando la ejecución de obras de mediano y largo plazo.

Finalmente, el sistema de cobro continúa operando bajo un esquema tradicional, sin la implementación de tecnologías modernas, lo que limita la eficiencia operativa y afecta la experiencia de los usuarios.

4.5.7. CONCLUSIONES

Durante el año 2025 se garantizó la continuidad del servicio en las vías que conforman el Sistema Provincial de Peajes, mediante la ejecución permanente de labores de mantenimiento rutinario, la atención oportuna de emergencias y el control eficiente de la recaudación, entre otras actividades operativas complementarias.

Estas acciones se desarrollaron bajo criterios de eficiencia y optimización en el uso de los recursos disponibles, priorizando la intervención en tramos críticos y asegurando la adecuada asignación de talento humano, equipos y materiales, lo que permitió mantener condiciones de transitabilidad seguras y funcionales, así como minimizar interrupciones en el servicio.

La gestión operativa se orientó a fortalecer los mecanismos de control y seguimiento, garantizando transparencia en la recaudación y contribuyendo a una administración responsable que respalde la sostenibilidad del sistema.

En este contexto, se encuentran en desarrollo estudios y análisis orientados a la modernización de las tecnologías actualmente obsoletas en hardware y software, como parte de una planificación estratégica que busca mejorar la eficiencia operativa, optimizar los procesos de gestión y fortalecer la calidad del servicio brindado a los usuarios.

4.6. GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS

4.6.1. PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

- **Asesoramiento de las Áreas Requirentes:** El Departamento de Contratación Pública ha brindado asesoramiento a las áreas requirentes, en las diferentes fases:
 - Preparatoria,
 - Precontractual,
 - Ejecución
 - Liquidación

Garantizar el estricto cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de contratación pública, asegurando que todos los procesos se desarrollen bajo principios de transparencia, eficiencia, responsabilidad y equidad.

- **Asesoramiento a la Máxima Autoridad:** Brindado en los diferentes procesos respecto a las respuestas y reclamos presentados por los proveedores ante la entidad y al SERCOP, velando siempre por los intereses institucionales y en estricto cumplimiento de la normativa que ampara la contratación pública.
- **Asesoramiento a Clientes Externos como GADs Provinciales y Parroquiales:** Cuando actuamos como proveedores del Estado y respecto al Giro de Negocio que tiene la Empresa, en temas de contratación pública con el objeto de consolidar los procesos, mismos que están enmarcados dentro de la normativa vigente.
- **Actualización y Ampliación de Códigos CPC para Uso del Giro de Negocio y Cambios en el Reglamento:** Se procedió a realizar una ampliación de CPCs para el uso del Giro específico de negocio y se procedió a actualizar el reglamento interno mediante Resolución Administrativa RESOLUCIÓN N° 165-AEP-GG-2025 ANEXO 7 GIRO ESPECIFICO DE NEGOCIO.

Debido a la Reforma a la LOSNCP se procedió a modificar el Reglamento mediante RESOLUCIÓN N° 200-AEP-GG-2025 ANEXO 8 GIRO ESPECIFICO DE NEGOCIO.

Debido a la Reforma del Reglamento a la LOSNCP se procedió a modificar el Reglamento mediante RESOLUCIÓN N° 203-AEP-GG-2025 ANEXO 9 GIRO ESPECIFICO DE NEGOCIO

4.6.2. PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

MODALIDAD	NRO MODALIDAD	PRESUPUESTO REFERENCIAL	VALOR ADJUDICADO
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	2	116,880.00	116,880.00
CATÁLOGO ELECTRÓNICO	125	406,678.86	373,330.92
CONTRATACIÓN DIRECTA	4	77,107.96	72,807.61
CONTRATACIÓN INTERADMINISTRATIVA	1	13,298.20	13,298.20
COTIZACIÓN	1	273,714.15	268,224.52
LICITACIÓN	1	783,874.14	724,218.11
MENOR CUANTÍA	15	1,196,902.66	1,194,422.66
PUBLICACIÓN ESPECIAL	48	4,297,848.71	4,297,848.71
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	10	665,174.73	500,795.61
TOTAL	207	7,831,479.41	7,561,826.34

4.6.3. RESULTADOS ECONÓMICOS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL AÑO

PRESUPUESTO REFERENCIAL	VALOR ADJUDICADO	DIFERENCIA
\$ 7.831.479,41	\$ 7.561.826,34	-\$ 269.653,07



Durante el año 2025, el Departamento de Contratación Pública ejecutó acciones orientadas a la actualización de la normativa del Giro Específico del Negocio, en concordancia con las reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General.

En el ámbito de la gestión, se evidenciaron resultados favorables en la administración de los procesos de contratación, reflejados en una optimización de los recursos institucionales, particularmente en la relación entre el presupuesto referencial y los valores adjudicados.

Adicionalmente, se reforzaron los mecanismos de control, especialmente en las fases de cierre y liquidación de procesos, garantizando el cumplimiento irrestricto de la normativa vigente y verificando la correcta organización de los expedientes en el archivo digital institucional, como respaldo operativo y técnico.

Estas acciones permitieron posicionar a ASFALTAR EP como un proveedor especializado en el ámbito de la contratación pública, consolidando su rol tanto como entidad contratante como oferente del Estado.

En este contexto, se evidencia una mejora cualitativa en la gestión, transitando de un enfoque reactivo hacia una gestión estratégica, alineada a las disposiciones normativas vigentes y orientada a fortalecer la eficiencia, la transparencia y la sostenibilidad en los procesos de contratación pública.

4.7. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Administrar el Talento Humano de la empresa, mediante la conformación y mantenimiento de una plantilla óptima de personal que contribuya al cumplimiento de los objetivos institucionales

Para ello, se promoverá el reconocimiento del desempeño a través de un esquema de remuneración conforme la normativa vigente y a los lineamientos institucionales, y se fomentará el desarrollo de un ambiente laboral adecuado, en cumplimiento de las políticas, normas e instrumentos del sector público y de la empresa.

4.7.1. PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

Gestión Administrativa del Talento Humano: Se implementaron procesos administrativos destinados a la actualización permanente de la situación laboral del personal y al cumplimiento de la normativa vigente del sector público. Entre los principales resultados se destacan:

- Ingresos y Salida de Personal
- Selección y Perfilamiento de Candidatos: Sesenta y seis (66)
- Actualización Permanente de los Expedientes del Personal


Desarrollo Organizacional y Capacitación: Con el objetivo de fortalecer las competencias del personal técnico y administrativo se gestionaron los siguientes temas:

TEMA	DURACIÓN	ASISTENTES
Aseguramiento del control interno en la organización	40 Horas	9
Control en la Administración de Contratos y Fiscalización	40 Horas	23
Control en la gestión documental y archivo	40 Horas	8
Control en las Fases de la Contratación Pública	40 Horas	35
Evaluación de la planificación y del presupuesto en el sector público	40 Horas	6
Estrategias de orientación al servicio	40 Horas	15
Formación de Equipos de Trabajo (Team Building)	8 Horas	200
Atención prehospitalaria, evacuación, uso y manejo de extintores	5 Horas	30
TOTAL	253 Horas	172

Bienestar, Clima Laboral y Seguridad y Salud Ocupacional: Con respecto al bienestar del personal en el entorno laboral se ejecutaron las siguientes actividades:

- Ocho programas de bienestar ejecutados:
 - Salud Mental
 - Prevención del Suicidio
 - Consumo de alcohol, tabaco y drogas
 - Manejo de estrés
 - Trabajo emocional
 - Violencia de género
 - Niño interno
 - Riesgo Psicosocial

A continuación, un resumen de Seguridad y Salud Ocupacional

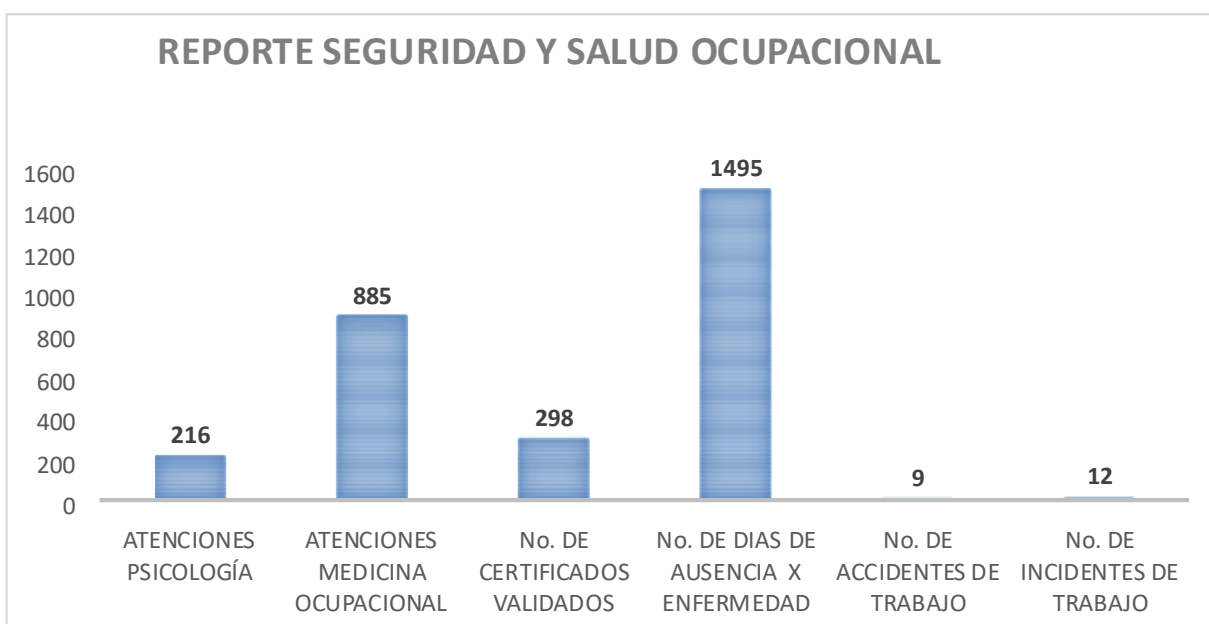

Gestión de Relaciones Laborales: Se mantuvo un relacionamiento técnico y oportuno con el Comité de Empresa y con las entidades reguladoras

- Procesos de diálogo social atendidos: Uno (1)
- Requerimientos del Ministerio de Trabajo tramitados: Tres (3)
- Intervención en procesos disciplinarios, reclamos y consultas internas: Dieciocho (18) procesos de régimen disciplinario ejecutados, de ellos se sancionaron:

- Amonestación verbal: Dos (2)
- Amonestación escrita: Tres (3)
- Sanción pecuniaria: Una (1)
- Sumario administrativo (1)
- Visto bueno: Uno (1)

Gestión de Remuneraciones: Se han elaborado los siguientes entregables que conllevan varias actividades de coordinación con las diferentes áreas de la empresa, la revisión y validación de documentos para ser procesados por esta Unidad Administrativa de Talento Humano.

ENTREGABLES	NRO
Roles mensuales	48
Roles de XIV remuneración	4
Roles de XIII remuneración	4
Liquidaciones de haberes	69

Gestión Estratégica: Talento Humano aportó al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales mediante:

- **Optimización de Procesos Internos:**
 - **Reformas al Estatuto de Gestión Orgánica por Procesos,** con el objetivo de alinear nuestra estructura institucional a la planificación estratégica de ASFALTAR EP, se realizaron dos (2) reformas; estas reformas fueron aprobadas por el Directorio con fecha 22 de julio (Subgerencia Administrativa y 25 de agosto (Unidad de Cumplimiento, Transparencia y Riesgo Empresarial.
 - **Igualmente se realizaron cinco (5) modificaciones al Manual de Descripción, Clasificación y Valoración de Puestos,** lo que permitió optimizar el distributivo de personal de acuerdo con las necesidades de la empresa.
- **Concursos de méritos y oposición:** La ejecución de los concursos de méritos y oposición por primera vez en la Empresa Pública ASFALTAR EP constituye un hito institucional relevante en el fortalecimiento de la gestión del talento humano, al garantizar procesos de selección basados en los principios de mérito, transparencia, igualdad de oportunidades y legalidad.

Esta iniciativa permitió profesionalizar el ingreso y la promoción del personal, reducir la discrecionalidad en la toma de decisiones, asegurar la

idoneidad de los perfiles para los puestos de trabajo y alinear la gestión del recurso humano con la normativa vigente del sector público.

Asimismo, sentó las bases para la consolidación de una cultura organizacional orientada a la eficiencia, la estabilidad laboral y la mejora continua del desempeño institucional.

En el año 2025, se realizaron cuatro (4) concursos de méritos y oposición teniendo los siguientes resultados:

PUESTOS EN CONCURSO	ESTADO	NRO.	APRUEBAN		
		POSTULANTES	VERIFICACIÓN DEL MÉRITO	PRUEBAS PSICOMÉTRICAS	PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS
GUARDALMACEN	GANADOR	546	71	15	2
SUPERVISOR DE TALLERES	DESIERTO	147	25	2	-
ASISTENTE ADMINISTRATIVO ADM.	GANADOR	1,428	571	59	16
ASISTENTE ADMINISTRATIVO GAF	GANADOR	544	277	40	5
TOTAL		2,665	944	116	23

- **Supresión de Puestos:** La implementación del proceso de supresión de puestos en la Empresa Pública ASFALTAR EP constituye un hito en la reestructuración organizacional, orientado a la optimización de la eficiencia institucional y al uso de los recursos públicos.

Esta intervención se sustentó en un análisis técnico de la estructura orgánica y funcional, permitiendo alinear la plantilla de personal con las necesidades operativas, la disponibilidad presupuestaria y los objetivos estratégicos institucionales, en estricto apego al marco normativo vigente.

- **Asesoría a la Máxima Autoridad:** Desde la Unidad de Talento Humano, se realizaron Ciento ochenta y tres (183) informes técnicos para procesos de selección de personal, régimen disciplinario, movimientos administrativos, reformas a los instrumentos de institucionalidad.

4.7.2. DESAFÍOS Y DIFICULTADES

El sistema de la empresa que registra toda la información y operaciones de talento humano presenta limitaciones funcionales, lo que restringe la disponibilidad de información en términos de calidad, oportunidad e integración de datos, afectando la toma de decisiones y el seguimiento de la gestión institucional.

Las restricciones presupuestarias, en el marco de la normativa vigente, condicionan la implementación de acciones preventivas en materia de riesgos

psicosociales y organizacionales, limitando el alcance de intervenciones orientadas al bienestar laboral y la gestión preventiva.

En este contexto, también limita los procesos de capacitación y desarrollo del talento humano con las necesidades críticas institucionales, dificultando la transición hacia modelos de formación especializados, medibles y orientados a resultados, particularmente en áreas misionales y los niveles de dirección y supervisión.

La empresa debe fortalecer la articulación entre la planificación estratégica, operativa y de talento humano, a fin de reducir riesgos de desalineación entre la estructura organizacional, el distributivo de personal y las necesidades reales de los procesos institucionales.

Finalmente, se identifica la necesidad de consolidar la institucionalización de los procesos de méritos y oposición como mecanismo regular de ingreso, promoción y cambios del personal, garantizando la idoneidad técnica, la eficiencia operativa y la transparencia en la gestión del talento humano, en concordancia con el marco normativo aplicable.

No obstante, durante el ejercicio 2025 la Unidad de Talento Humano de ASFALTAR EP ejecutó sus funciones estratégicas y operativas conforme a sus competencias, asegurando:

Ejecución de la gestión integral del talento humano conforme a la normativa vigente, garantizando la administración adecuada del personal, la dotación oportuna de recursos humanos a las distintas áreas institucionales y el soporte técnico permanente a los procesos administrativos y operativos de la empresa

Actualización y mantenimiento permanente de los expedientes laborales del personal, asegurando la disponibilidad de información confiable, organizada para cumplir adecuadamente con los requerimientos internos y externos.

Ejecución de procesos de capacitación y desarrollo organizacional alineados a la planificación institucional, fortaleciendo competencias técnicas, administrativas y conductuales del personal en temas relacionados con control interno, contratación pública, trabajo en equipo y seguridad laboral.

Desarrollo de acciones de evaluación y seguimiento del clima laboral, permitiendo identificar condiciones organizacionales relevantes para la mejora del ambiente de trabajo y la gestión interna del talento humano.

Implementación de acciones de bienestar social y atención integral al personal, incluyendo acompañamiento en salud física y mental mediante apoyo médico, psicológico y de trabajo social, contribuyendo a la atención oportuna de casos individuales.

Gestión de procesos relacionados con trámites de permisos médicos, licencias y control de novedades, contribuyendo a la continuidad operativa

Ejecución de procesos de concursos de méritos y oposición, así como de supresión de puestos, orientados al ordenamiento técnico del talento humano, la optimización de la estructura organizacional y la mejora de la eficiencia institucional.

Implementación y fortalecimiento de acciones en materia de seguridad industrial y salud ocupacional, orientadas a la prevención de riesgos laborales mediante la identificación, evaluación y control de condiciones inseguras en el entorno de trabajo.

Estas acciones incluyeron el seguimiento de incidentes y accidentes laborales, la ejecución de medidas preventivas, la capacitación en seguridad laboral y la articulación con el sistema de salud ocupacional institucional, contribuyendo a la reducción de riesgos y a la continuidad de las operaciones institucionales.

5. PREGUNTAS REALIZADAS POR LA CIUDADANÍA

PREGUNTAS REALIZADAS DE LOS REPRESENTANTES CIUDADANOS DENTRO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERIODO FISCAL 2025

Pregunta 1

Nombre: Manuel

Cantón: Cuenca

¿Cuántos kilómetros de asfaltado se ejecutan anualmente en la provincia y cuál es la planificación para vialidad rural? Además, solicita mantener las mingas comunitarias para mantenimiento de vías alternas de lastre.

- El número de kilómetros anuales son variables de acuerdo con la longitud de los frentes de trabajo activos, sin embargo, en la presente administración se han ejecutado 241 Km de mejoramiento a nivel de carpeta asfáltica.
- Las mingas comunitarias se mantendrán, sin embargo, se restringe su ejecución en función de los cambios aprobados por la asamblea al COOTAD.

Pregunta 2

Nombre: Matilde Cuesta

Cantón: Cuenca

Consulta sobre el cumplimiento del ofrecimiento de construir rompevelocidades y finalizar obras complementarias (señalización) en la vía que conecta Tarqui y Turi, pese a haber ingresado oficios en la Prefectura.

- La vía Turi – Tarqui se mantiene en mantenimientos periódicos que incluyen bacheo, señalización y mantenimiento de cunetas, la construcción de reductores de velocidad se efectuará una vez que se cuente con mezcla asfáltica (restringido por incendio en la refinería) y de acuerdo con inspecciones que permitan la construcción en sitios adecuados acorde a la normativa vigente.

Pregunta 3

Nombre: Cristina Mirela

Cantón: Cuenca

Sugiere mantener las mingas comunitarias para mantenimiento de vías rurales y alternas de lastre.

- Las mingas comunitarias se mantendrán, sin embargo, se restringe su ejecución en función de los cambios aprobados por la asamblea al COOTAD.

Pregunta 4

Nombre: Diana Robles

Cantón: Cuenca

Solicita revisión e intervención en una vía que se encuentra en deterioro y abandono; consulta si la vía es competencia del GAD Provincial del Azuay.

- Se requiere la ubicación de la vía de acuerdo con coordenadas, para verificar si se encuentra en zona de competencia de la Prefectura del Azuay.

Pregunta 5

Nombre: Representantes de la comunidad Potrerillos

Cantón: Nabón

Señalan que, aunque se logró abrir la vía con apoyo del GADPA, existen problemas en los desagües y cunetas laterales que no han sido reparados, lo que provoca deterioro acelerado de la vía (sector Pinillos – Potrerillos – Carchi).

- La vía es Cachi - Potrerillos, mantenemos de forma permanente el equipo para limpieza y habilitación de la vía, además se entregaron ármicos en placas a la comunidad para que una vez armados puedan ser instalados por parte del GPA, el invierno afecta las intervenciones realizadas en la zona, sin embargo, nos mantenemos activos para la habilitación y recuperación de la calzada en las zonas afectadas.

Pregunta 6

Nombre: Enma Torres

Cantón: Cuenca

Solicita apoyo para mantener habilitada la vía Cuenca – Molleturo – Naranjal (especialmente km 43 y km 103) pese a no ser competencia del GADPA, debido a derrumbes, cunetas tapadas y problemas de movilidad. Además, solicita apoyo para reparación de puentes en comunidades costaneras incomunicadas.

- El arreglo de la red estatal se encuentra a cargo del Gobierno Nacional a través del MIT, de parte de la Prefectura se ha solicitado en varias

ocasiones que se delegue la competencia, sin obtener resultados favorables.

- Sobre los puentes afectado producto de la fuerte etapa invernal, la Prefectura del Azuay se encuentra llevando a cabo el proceso para la compra de 5 puentes Bailey.

Pregunta 7

Nombre: Sr. Flores Remache (Consejo de Planificación – cuenca Jubones)

Cantón: Nabón

Propone establecer mecanismos de concurrencia con comunidades para proyectos de riego y mejorar la ejecución de obras hidráulicas, incluyendo alcantarillado y pasos de agua para evitar deterioro de las vías.

- La competencia de planificación, construcción, operación y mantenimiento de sistemas de riego y drenaje corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, así como a los usuarios y prestadores del servicio, ya sean de carácter comunitario o privado. En este sentido, esta Dirección puede ejercer de manera directa sus competencias en lo referente a infraestructura de riego y drenaje, promoviendo además la articulación y participación de las comunidades beneficiarias.
- No obstante, en lo que respecta a la implementación de sistemas de alcantarillado y otras obras asociadas al saneamiento, dichas competencias corresponden a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, por lo que su ejecución requiere necesariamente procesos de coordinación interinstitucional.

Pregunta 8

Nombre: Representante ciudadano

Cantón: No especificado

Consulta sobre la planificación institucional para fortalecer el sector agrícola y mejorar la situación productiva del ámbito rural.

- El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Azuay, en el marco del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), priorizó el fortalecimiento de diez sistemas productivos estratégicos: aguacate, café, cacao, leche, papa, tomate de árbol, miel de abeja, hortalizas, frutales y cuyes, seleccionados en función de su aporte a la economía territorial, su demanda en el mercado y su potencial de escalamiento comercial.
- La línea base establecida al año 2024 evidenció que estos sistemas presentan limitaciones en niveles de productividad, acceso a insumos

tecnificados, cumplimiento de normativa sanitaria, capacidades organizativas y vinculación con mercados formales, así como una baja incorporación de innovación tecnológica y soluciones energéticas eficientes.

- En este contexto, a partir del año 2024 se viene implementando un modelo de intervención integral en articulación con la Compañía de Economía Mixta AGROAZUAY (CEM AGROAZUAY) y la Dirección de Fomento de la Producción Social y Solidaria (FPSS). La CEM AGROAZUAY ejecuta procesos de asesoramiento técnico especializado, fortalecimiento productivo, así como la dotación de herramientas e insumos, orientados a mejorar la eficiencia, calidad y rendimiento de las unidades productivas, obteniendo como resultado 2.334 productores capacitados en buenas prácticas productivas y gestión, y 810 productores que implementan mejoras técnicas directas en sus sistemas productivos.
- Para el año 2026, el GAD Provincial del Azuay en su planificación institucional continuará con el fortalecimiento de los sistemas productivos y además a previsto, brindar acompañamiento y asesoría técnica a los emprendimientos de valor agregado en el trámite de obtención de notificación sanitaria, además de impulsar estrategias de marketing y comercialización que faciliten el acceso a mercados formales, promover la innovación productiva, incorporando el uso de drones para la optimización de labores agrícolas, incremento de la productividad, incorporar alternativas basadas en energías renovables que contribuyan a optimizar costos de producción de los pequeños productores rurales y fortalecer la organización de la economía popular y solidaria.
- En conjunto, estas acciones configuran un proceso sostenido de fortalecimiento técnico, productivo y comercial que contribuye a mejorar la competitividad de los sistemas productivos priorizados, dinamizar la economía popular y solidaria y consolidar el desarrollo sostenible del sector agro-productivo en la provincia del Azuay.

Javier Fernández de Córdova Webster

Gerente General

ASFALTAR EP
